



**2025 Yılı Devam Eden Projeler**

**Eđitim Yükseköđretim Sektörü**

## MERKEZİ KÜTÜPHANE BİNASI ETÜT PROJE İŞİ


- Sözleşme tarihi : 20.03.2025
- İşin başlangıç tarihi : 25.03.2025
- İşin bitim tarihi : 22.07.2025
- Toplam sözleşme bedeli : 1.778.268,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 1.778.268,00-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 1.778.268,00-TL (KDV dahil)



# MERKEZİ KÜTÜPHANE BİNASI ETÜT PROJE İŞİ

Zemin etüt işleri, avan projeler, tamamlanmıştır. Mimari detay projeleri, statik, mekanik ve elektrik tesisat projeleri tamamlanmış ve işin kabulü yapılmıştır. 2025 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme % 100 ve toplam nakdi gerçekleştirme %100 olmuştur.

Gerçekleşme

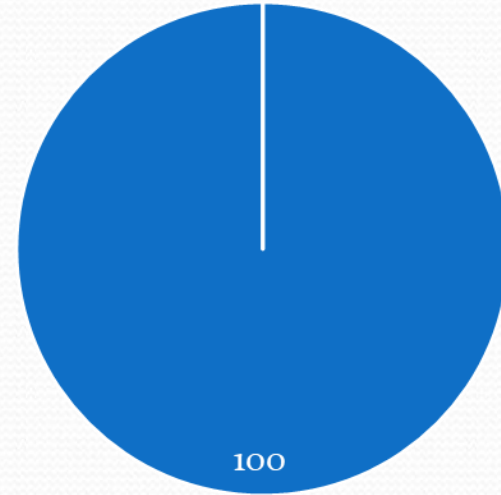


■ Tamamlanan

■ Kalan



# MERKEZİ KÜTÜPHANE BİNASI ETÜT PROJE İŞİ

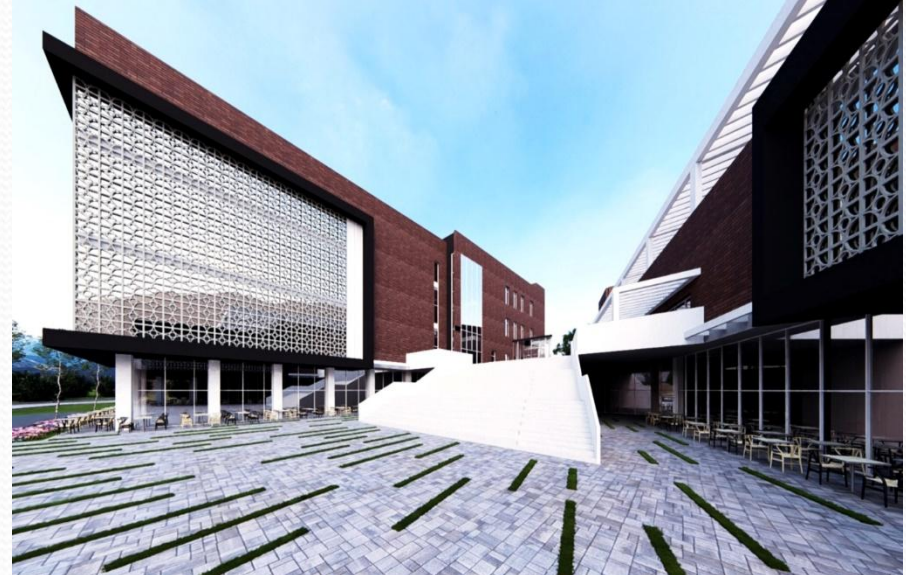


## REKTÖRLÜK BİNASI ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

- Sözleşme tarihi : 26.09.2024
- İşin başlangıç tarihi : 01.10.2024
- İşin bitim tarihi : 16.05.2025
- Toplam sözleşme bedeli : 20.498.327,42-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 20.498.327,42-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 5.385.277,58-TL (KDV dahil)




## REKTÖRLÜK BİNASI ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

İş tamamlanmış olup; geçici kabul eksiklikleri yapılmaktadır. 2025 yılı fiziki gerçekleştirme %23 artarak toplam fiziki gerçekleştirme %100 ve toplam nakdi gerçekleştirme %100 olmuştur.

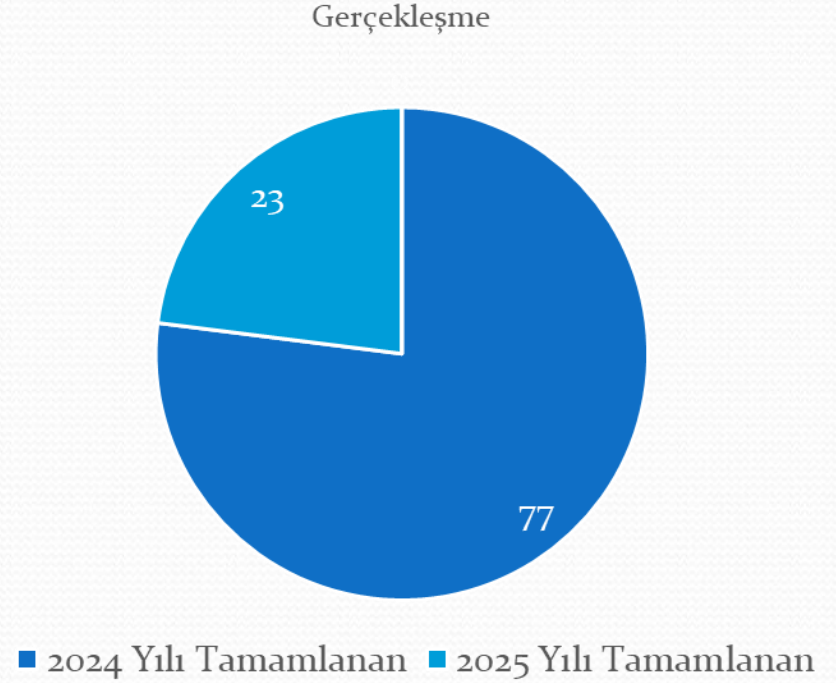

# REKTÖRLÜK BİNASI ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

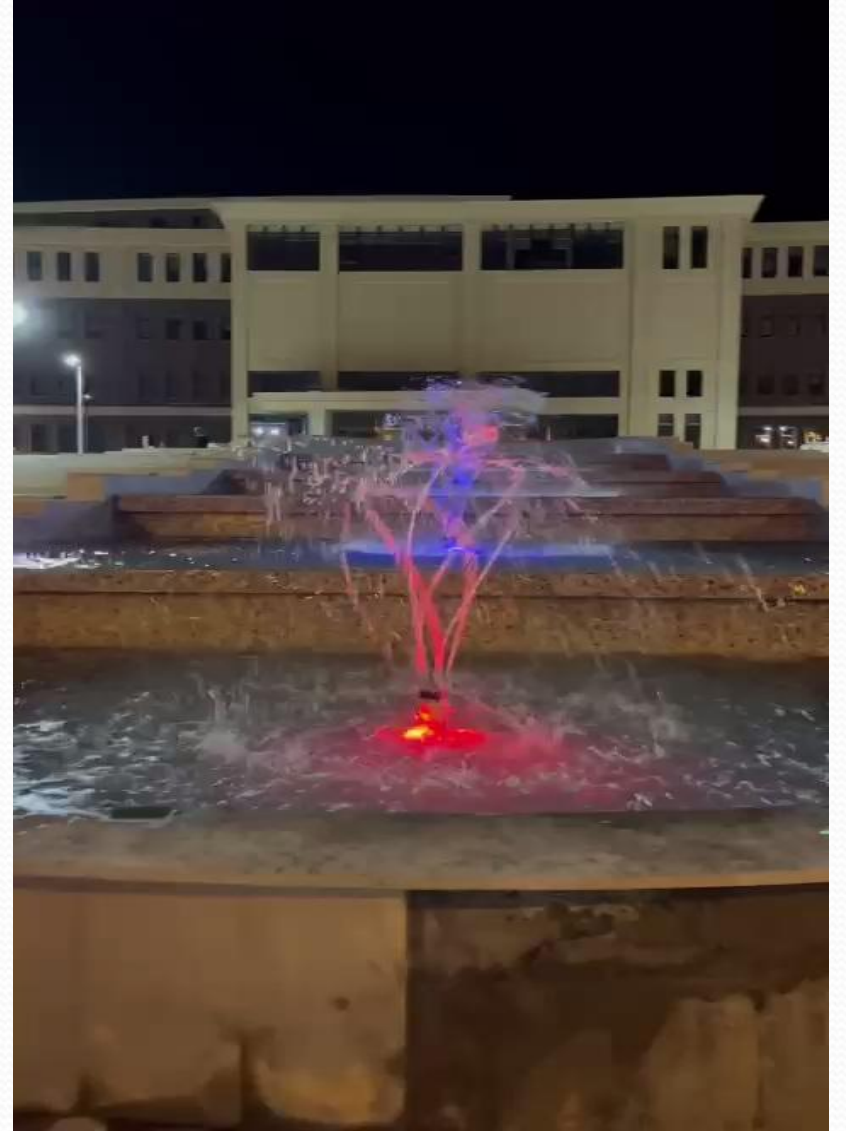

## GARAJ YAPIMI İŐİ


- Sözlēme tarihi : 04.12.2024
- İŐin baŐlangıç tarihi : 06.12.2024
- İŐin bitim tarihi : 04.04.2025
- Toplam sözlēme bedeli : 3.428.356,75-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 3.428.356,75-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 3.428.356,75-TL (KDV dahil)



## GARAJ YAPIMI İŐİ

İŐ tamamlanmıŐ olup; geçici kabulü yapılmıŐtır. 2025 yılı fiziki gerçekteŐme %51 artarak toplam fiziki gerçekteŐme %100 ve toplam nakdi gerçekteŐme %100 olmuŐtur.

### GerçekteŐme

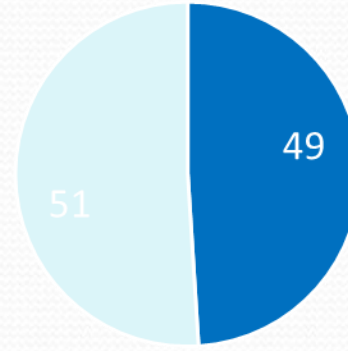

- 2024 Yılı Tamamlanan
- 2025 Yılı Tamamlanan

# TAŞLIÇIFTLİK KAMPÜSÜ VE NİKSAR MYO MEKANİK TESİSAT İŞLERİ


- Sözleşme tarihi : 07.04.2025
- İşin başlangıç tarihi : 11.04.2025
- İşin bitim tarihi : 21.11.2025
- Toplam sözleşme bedeli : 28.610.160,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 24.576.885,22-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 24.576.885,22-TL (KDV dahil)



# TAŞLIÇIFTLİK KAMPÜSÜ VE NIKSAR MYO MEKANİK TESİSAT İŞLERİ

İslami İlimler Fakültesi eşanjör tesisatı işleri, Niksar Meslek Yüksek Okulu Isı Merkezi eşanjör imalatları, Isı Merkezi kızgın su kazan imalatları, brülör imalatları, kalorifer ve doğalgaz iç tesisat imalatları, baca imalatları tamamlanmıştır. 2025 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme % 100 ve toplam nakdi gerçekleştirme % 86 olmuştur.

## Gerçekleşme

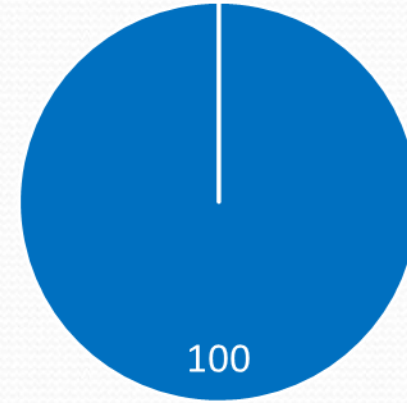

■ Tamamlanan ■ Kalan

# TAŞLIÇIFTLIK KAMPÜSÜ VE NİKSAR MYO MEKANİK TESİSAT İŞLERİ



## SIFIR ATIK SAHA BETONU VE GİRİŞ YOLU YAPIMI


- Sözleşme tarihi : 07.04.2025
- İşin başlangıç tarihi : 11.04.2025
- İşin bitim tarihi : 23.05.2025
- Toplam sözleşme bedeli : 635.593,82-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 635.593,82-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 635.593,82-TL (KDV dahil)



## SIFIR ATIK SAHA BETONU VE GİRİŞ YOLU YAPIMI

İş tamamlanmış olup; geçici kabulü yapılmıştır. 2025 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %100 ve toplam nakdi gerçekleştirme %100 olmuştur.

### Gerçekleşme

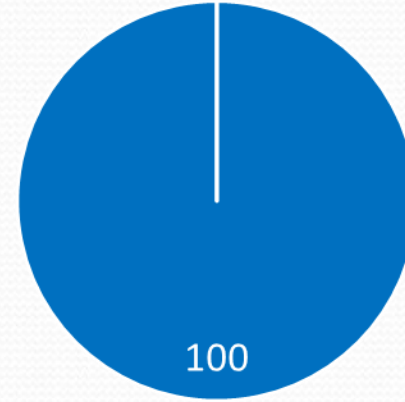

■ Tamamlanan ■ Kalan

## SAĞLIK KAMPÜSÜ 1000 TONLUK SU DEPOSU


- Sözleşme tarihi : 17.09.2025
- İşin başlangıç tarihi : 22.09.2025
- İşin bitim tarihi : 18.02.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 18.856.674,64-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 6.706.219,87-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 6.706.219,87-TL (KDV dahil)



## SAĞLIK KAMPÜSÜ 1000 TONLUK SU DEPOSU


Kazı imalatları, temel izolasyon imalatları, temel grobeton imalatları ve temel radye beton, demir ve kalıp imalatları tamamlanmıştır. Betonarme perde ve temel topraklama imalatları devam etmektedir. 2025 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %37 ve toplam nakdi gerçekleşme %35 olmuştur.

### Gerçekleşme

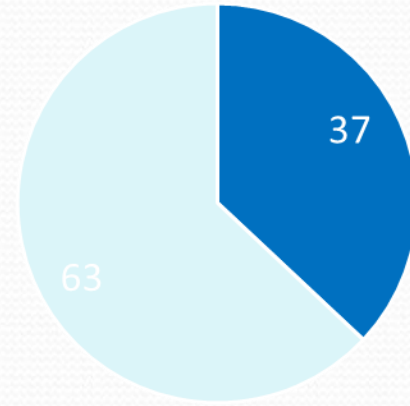

■ Tamamlanan ■ Kalan

# SAĞLIK KAMPÜSÜ 1000 TONLUK SU DEPOSU

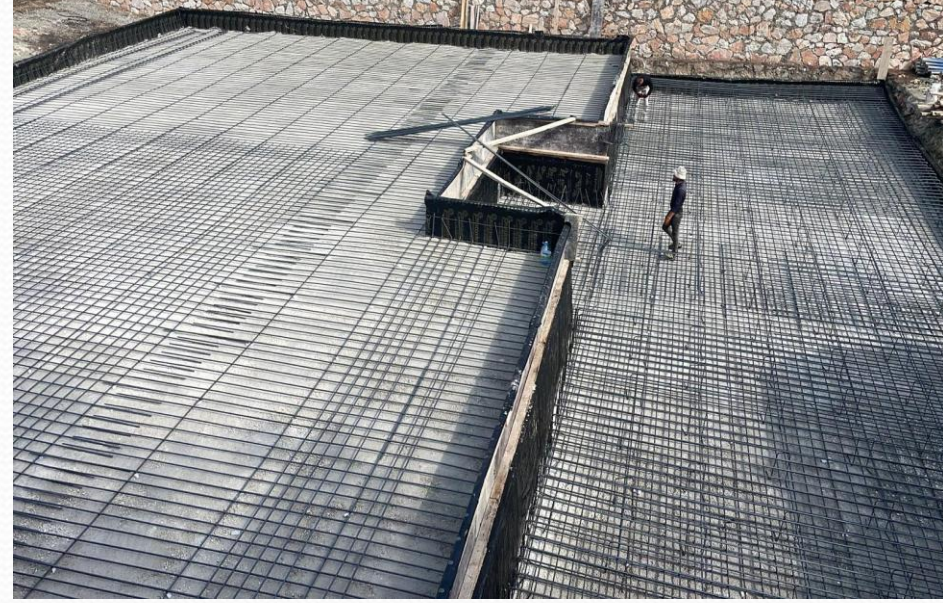


## HUKUK FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI

- Kapalı Alan : 10.244 m<sup>2</sup>
- Sözleşme tarihi : 08.12.2023
- İşin başlangıç tarihi : 12.12.2023
- İşin bitim tarihi : 10.11.2025
- Toplam sözleşme bedeli : 199.774.611,99-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 166.478.843,33-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 78.910.884,26-TL (KDV dahil)



## HUKUK FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI

Tüm imalatlar tamamlanmış olup; iş geçici kabul aşamasındadır. 2025 yılı fiziki gerçekleşme %34 artarak toplam fiziki gerçekleşme %99 ve toplam nakdi gerçekleşme %97 olmuştur.

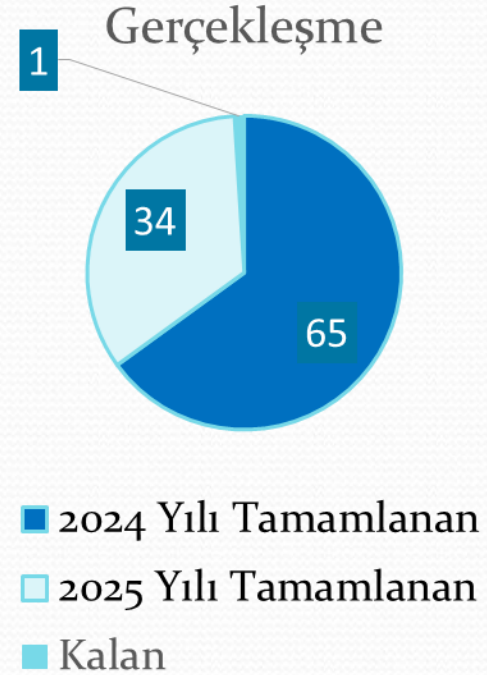

# HUKUK FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI




## YENİ REKTÖRLÜK BİNASI PROTOKOL GİRİŞİ KAPLAMA İŞİ

- Sözleşme tarihi : 26.05.2025
- İşin başlangıç tarihi : 28.05.2025
- İşin bitim tarihi : 10.06.2025
- Toplam sözleşme bedeli : 5.040.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 5.040.000,00-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 5.040.000,00-TL (KDV dahil)

Rektör makam odası ve Rektör yardımcısı odaları kaplama, Rektör makam odası, Rektörlük giriş kaplama ve fayans işleri tamamlanmıştır. İş tamamlanmış ve kabulü yapılmıştır. 2025 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %100 ve toplam nakdi gerçekleştirme %100 olmuştur.

### Gerçekleşme

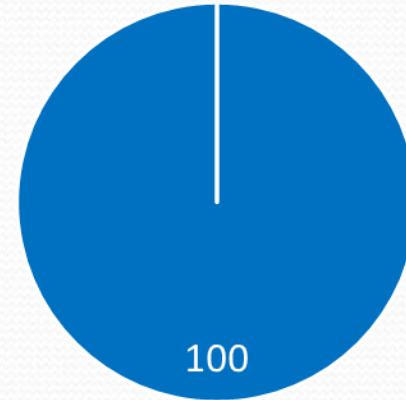

■ Tamamlanan ■ Kalan

## GIDA MÜHENDİSLİĞİ SÜT İŞLEME TESİSİ YAPIMI


- Sözleşme tarihi : 07.04.2025
- İşin başlangıç tarihi : 11.04.2025
- İşin bitim tarihi : 19.06.2025
- Toplam sözleşme bedeli : 7.387.364,72-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 7.387.364,72-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 7.387.364,72-TL (KDV dahil)



## GIDA MÜHENDİSLİĞİ SÜT İŞLEME TESİSİ YAPIMI

İş tamamlanmış olup; geçici kabul aşamasındadır. 2025 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %100 ve toplam nakdi gerçekleştirme %100 olmuştur.

### Gerçekleşme

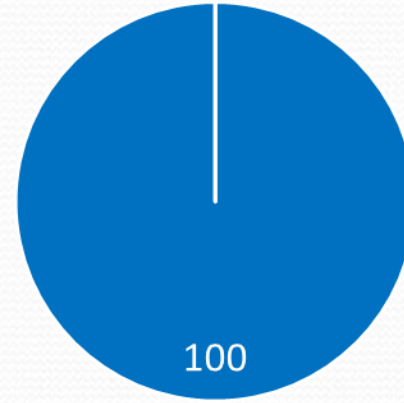

■ Tamamlanan ■ Kalan

# GIDA MÜHENDİSLİĞİ SÜT İŞLEME TESİSİ YAPIMI



# REKTÖRLÜK, ENSTİTÜLER, FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR 2025 YILI BÜYÜK ONARIM İNŞAATI

- Sözleşme tarihi : 12.05.2025
- İşin başlangıç tarihi : 15.05.2025
- İşin bitim tarihi : 13.07.2025
- Toplam sözleşme bedeli : 1.586.400,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 1.586.400,00-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 1.586.400,00-TL (KDV dahil)




Pazar MYO alüminyum doğrama işleri

# REKTÖRLÜK, ENSTİTÜLER, FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR 2025 YILI BÜYÜK ONARIM İNŞAATI

- Sözleşme tarihi : 12.05.2025
- İşin başlangıç tarihi : 15.05.2025
- İşin bitim tarihi : 13.07.2025
- Toplam sözleşme bedeli : 1.586.400,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 1.586.4000,00-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 1.586.400,00-TL (KDV dahil)

Almus MYO alçıpan ile oda bölme işleri, öğrenci girişi engelli rampa imalatı, Pazar MYO bankacılık bölümü alüminyum doğrama ile bölme işi, Tokat MYO güvenlik kabini bölme işi, Fen Edebiyat Fakültesi öğretim görevli odası yapımı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrenci kütüphane yapımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlileri için oda yapımı işleri tamamlanmıştır. İş geçici kabul aşamasındadır. 2025 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %100 ve toplam nakdi gerçekleştirme %100 olmuştur.

## Gerçekleşme

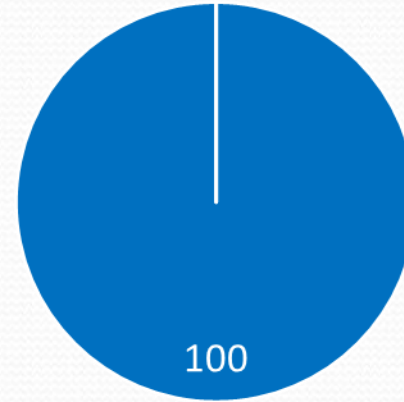

■ Tamamlanan ■ Kalan

# REKTÖRLÜK, ENSTİTÜLER, FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR 2025 YILI BÜYÜK ONARIM İNŞAATI



Fen Edebiyat Fakültesi Onarım işleri  
Fen Edebiyat Fakültesi Onarım işleri




Almus MYO duvar bölme işleri



Tokat MYO güvenlik kabini yapımı

## 2025 YILI 2.KISIM BÜYÜK ONARIM İNŞAATI


- Sözleşme tarihi : 17.10.2025
- İşin başlangıç tarihi : 20.10.2025
- İşin bitim tarihi : 08.12.2025
- Toplam sözleşme bedeli : 4.618.800,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)

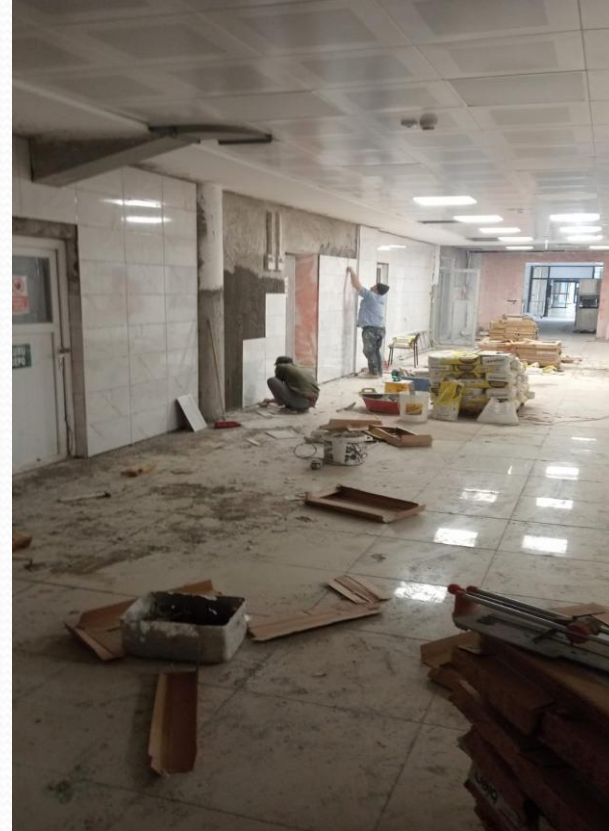

## 2025 YILI 2.KISIM BÜYÜK ONARIM İNŞAATI

Merkezi Kafeterya Binası mutfak ve tuvalet tadilat işleri devam etmektedir. 2025 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %20 ve toplam nakdi gerçekleşme %0 olmuştur.

### Gerçekleşme

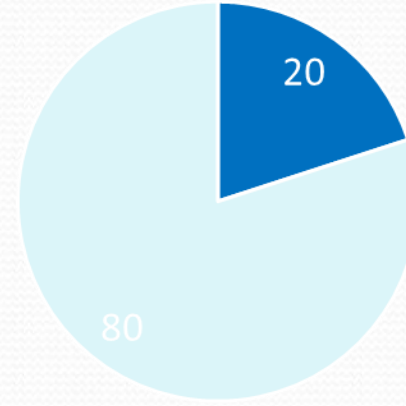


■ Tamamlanan ■ Kalan

## 2025 YILI 3.KISIM BÜYÜK ONARIM İNŞAATI

- Sözleşme tarihi : 13.11.2025
- İşin başlangıç tarihi : 17.11.2025
- İşin bitim tarihi : 16.12.2025
- Toplam sözleşme bedeli : 3.067.998,82-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)

Eğitim Fakültesi tuvalet tadilat işleri, Turhal MYO Binası tadilat işleri devam etmektedir. 2025 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %20 ve toplam nakdi gerçekleştirme %0 olmuştur.

### Gerçekleşme

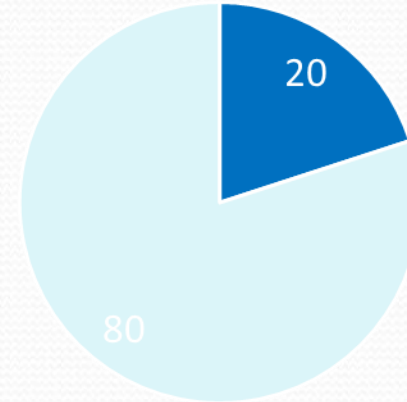

■ Tamamlanan ■ Kalan

# **2025 Yılı Devam Eden Projeler**

## **Saęlık Sektörü**

## DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ HASTANE BİNASI ETÜT PROJE İŐİ

- Sözlşme tarihi : 25.03.2025
- İŐin baŐlangıŐ tarihi : 02.04.2025
- İŐin bitim tarihi : 30.07.2025
- Toplam sözlşme bedeli : 1.662.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 1.662.000,00-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 1.662.000,00-TL (KDV dahil)




## DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ HASTANE BİNASI ETÜT PROJE İŐİ

- Sözleşme tarihi : 25.03.2025
- İşin başlangıç tarihi : 02.04.2025
- İşin bitim tarihi : 30.07.2025
- Toplam sözleşme bedeli : 1.662.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 1.662.000,00-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 1.662.000,00-TL (KDV dahil)

Zemin etüt işleri, mimari, statik, mekanik ve elektrik tesisat projeleri tamamlanmış, işin kabulü yapılmıştır. 2025 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme % 100 ve toplam nakdi gerçekleştirme % 100 olmuştur.

### Gerçekleşme

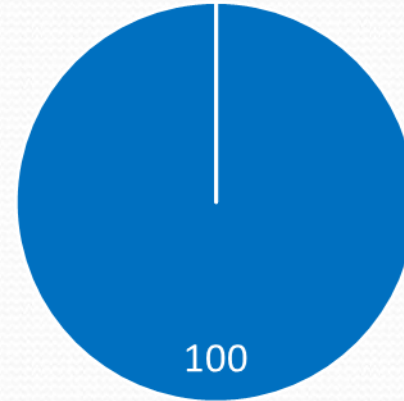

■ Tamamlanan ■ Kalan

# DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANE BİNASI ETÜT PROJE İŞİ



## ACİL VE YOĐUN BAKIM BİNASI


- Kapalı Alan : 5.480 m<sup>2</sup>
- Sözleşme tarihi : 31.05.2024
- İşin başlangıç tarihi : 03.06.2024
- İşin bitim tarihi : 11.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 199.956.105,34-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 156.704.742,52-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 107.508.743,04-TL (KDV dahil)



## ACIL VE YOĐUN BAKIM BİNASI

Acil Binası bodrum kat ve istinat duvarları betonarme imatları, bodrum kat perdeleri su yalıtımı ve ısı yalıtımı imatları, tüm katlar betonarme imatları, perde betonu yalıtımı ve bodrum kat pis su ve yağmur suyu hattı imatları tamamlanmıştır. Çatı teras imatları, dış cepha kaplama imatları, sıva imatları, mekanik ve elektrik tesisat imatları devam etmektedir. 2025 yılı fiziki gerçekteşme %38 artarak toplam fiziki gerçekteşme %77 ve toplam nakdi gerçekteşme %75 olmuştur.

### Gerçekteşme

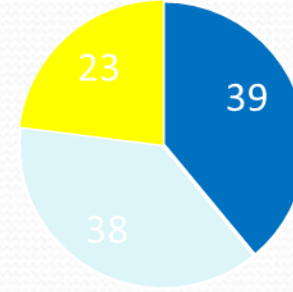

- 2024 Yılı Tamamlanan
- 2025 Yılı Tamamlanan
- Kalan

## ACIL VE YOĐUN BAKIM BİNASI



## HASTANE EK BİNA (KATLI OTOPARK)


- Kapalı Alan : 6.250 m<sup>2</sup>
- Sözleşme tarihi : 29.09.2025
- İşin başlangıç tarihi : 06.10.2025
- İşin bitim tarihi : 01.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 89.994.833,60-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 11.216.102,17-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 11.216.102,17-TL (KDV dahil)



## HASTANE EK BİNA (KATLI OTOPARK)

Kazı imalatları, temel izolasyon imalatları, temel grobeton imalatları tamamlanmıştır. Temel radye demir imalatları devam etmektedir. 2025 yılı fiziki gerekleşme ile toplam fiziki gerekleşme %15 ve toplam nakdi gerekleşme %12 olmuştur.

### Gerekleşme

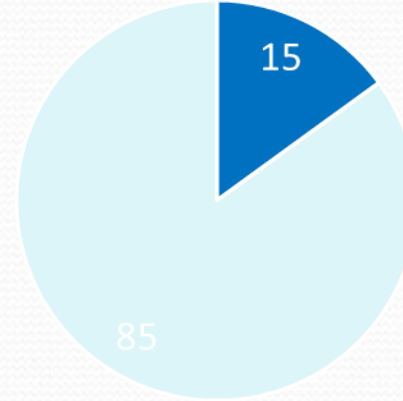

■ Tamamlanan ■ Kalan

# HASTANE EK BİNA (KATLI OTOYERK)



## DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ HASTANESİ BİNASI


- Kapalı Alan : 12.730 m<sup>2</sup>
- Sözleşme tarihi : 10.11.2025
- İŐin başlangıç tarihi : 14.11.2025
- İŐin bitim tarihi : 12.03.2028
- Toplam sözleşme bedeli : 513.240.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)



# DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ HASTANESİ BİNASI

Kazı imalatları devam etmektedir. 2025 yılı fiziki gerekleşme ile toplam fiziki gerekleşme %2 ve toplam nakdi gerekleşme %0 olmuştur.

## Gerekleşme

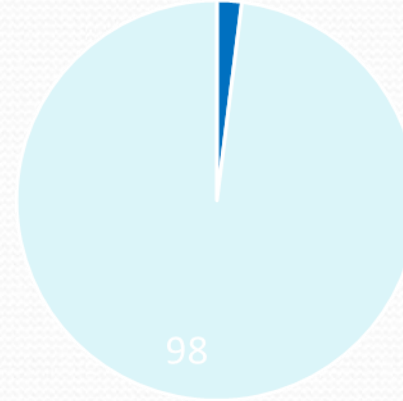

■ Tamamlanan ■ Kalan

## 2025 YILI ARAŐTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ONARIMI


- Sözleşme tarihi : 25.06.205
- İşin başlangıç tarihi : 30.06.2025
- İşin bitim tarihi : 12.09.2025
- Toplam sözleşme bedeli : 4.266.651,76-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 4.266.651,76-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 4.266.651,76-TL (KDV dahil)



## 2025 YILI ARAŐTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ONARIMI

Teras su yalıtımı imalatları, katlarda seramik ve boya imalatları tamamlanmış ve işin geçici kabulü yapılmıştır. 2025 yılı fiziki gerçekteşme ve toplam fiziki gerçekteşme %100 ve toplam nakdi gerçekteşme %100'dür.

### Gerçekteşme

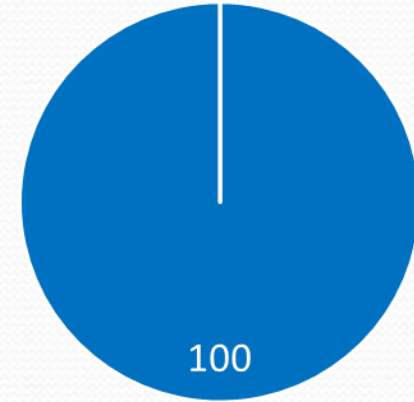

■ Tamamlanan ■ Kalan

## 2025 YILI ARAŐTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ONARIMI

