

2026 Yılı Devam Eden Projeler


Eđitim Y¼ksek¼đretim Sekt¼r¼

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LABORATUVAR BİNASI ETÜT PROJE İŞİ

- Sözleşme tarihi : 20.04.2026
- İşin başlangıç tarihi : 24.04.2026
- İşin bitim tarihi : 21.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 1.416.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)

Sözleşme imzalanmış, zemin etüt işleri, mimari avan projeleri tamamlanmıştır. Mimari uygulama projeleri ile statik projesi, mekanik ve elektrik avan projeleri devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme % 15 ve toplam nakdi gerçekleştirme %0 olmuştur.

Gerçekleşme

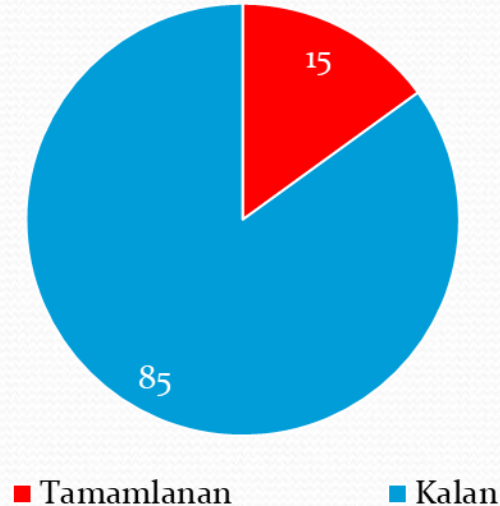


ZİLE MYO ISI MERKEZİ İLE ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO ISI MERKEZİ REVİZYON İŞLERİ

- Sözleşme tarihi : 04.03.2026
- İşin başlangıç tarihi : 09.03.2026
- İşin bitim tarihi : 05.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 3.036.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 3.036.000,00-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 3.036.000,00-TL (KDV dahil)



ZİLE MYO ISI MERKEZİ İLE ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO ISI MERKEZİ REVİZYON İŞLERİ

Zile MYO Isı Merkezi ve Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO mevcut eski kalorifer kazanları ile ekipmanlarının demontajı, hurda mutfak ekipmanlarının demontajı, yeni kaskad sistem yoğunmalı duvar tipi kalorifer kazanlarının ve ekipmanları ile ısıtma tesisat işleri, sıhhi tesisat işleri, elektrik tesisat işleri, doğalgaz tesisat işleri ve baca imalatları tamamlanmıştır. İş tamamlanmış, geçici kabulü yapılmıştır. 2026 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme % 100 ve toplam nakdi gerçekleştirme %100 olmuştur.

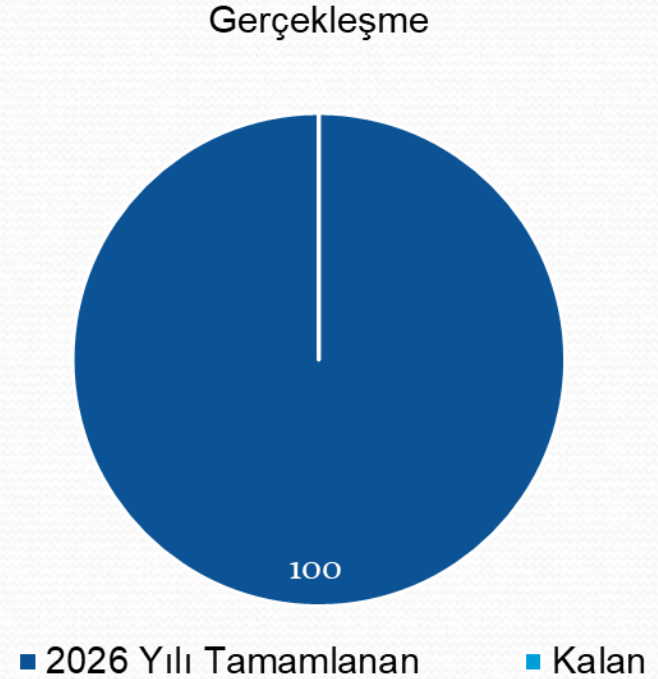

ZİLE MYO ISI MERKEZİ İLE ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO ISI MERKEZİ REVİZYON İŞLERİ



SAĞLIK KAMPÜSÜ 1000 TONLUK SU DEPOSU


- Sözleşme tarihi : 17.09.2025
- İşin başlangıç tarihi : 22.09.2025
- İşin bitim tarihi : 17.06.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 20.555.865,85-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 17.640.170,88-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 7.636.858,66-TL (KDV dahil)



SAĞLIK KAMPÜSÜ 1000 TONLUK SU DEPOSU

Kazı imalatları, tüm temel imalatları, betonarme imalatları, manevra odası perde imalatları tamamlanmıştır. Su deposu sıva ve seramik imalatları, kanal imalatı, mekanik tesisat imalatları devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleştirme %35 artarak toplam fiziki gerçekleştirme %89 ve toplam nakdi gerçekleştirme %85 olmuştur.

Gerçekleşme

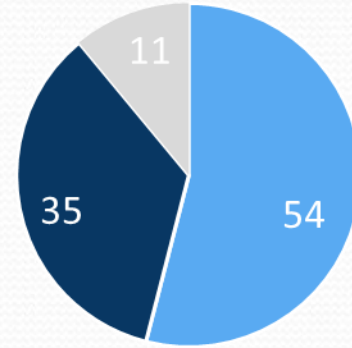

- 2025 Yılı Tamamlanan
- 2026 Yılı Tamamlanan
- Kalan

SAĞLIK KAMPÜSÜ 1000 TONLUK SU DEPOSU



KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI


- Sözleşme tarihi : 01.12.2025
- İşin başlangıç tarihi : 04.12.2025
- İşin bitim tarihi : 10.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 16.185.208,90-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 12.543.373,77-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 9.280.596,60-TL (KDV dahil)



KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI

İslami İlimler Fakültesi kazı imalatları, İslami İlimler Fakültesi beton imalatları, İslami İlimler Fakültesi önü açık spor tesisleri beton imalatları, Mühendislik yolu perde duvar ve yaya yolu tadilat işleri, İslami İlimler Fakültesi yaya yolu Yeni Rektörlük Binası çevre perde duvar sıva imalatları tamamlanmıştır. Kamelya imalatları, Hukuk Fakültesi çevre düzenleme işleri devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleştirme %55 artarak toplam fiziki gerçekleştirme %78 ve toplam nakdi gerçekleştirme %76 olmuştur.

Gerçekleşme

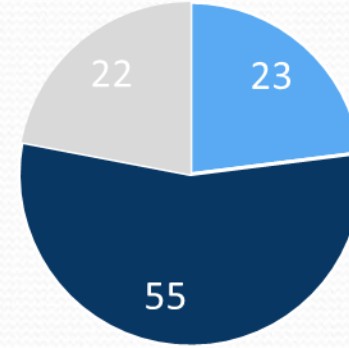

- 2025 Yılı Tamamlanan
- 2026 Yılı Tamamlanan
- Kalan

KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI




ERBAA MYO VE REŞADIYE MYO ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

- Sözleşme tarihi : 07.05.2026
- İşin başlangıç tarihi : 12.05.2026
- İşin bitim tarihi : 09.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 11.280.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)

12.05.2026 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2026 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %5 ve toplam nakdi gerçekleştirme %0 olmuştur.

Gerçekleşme

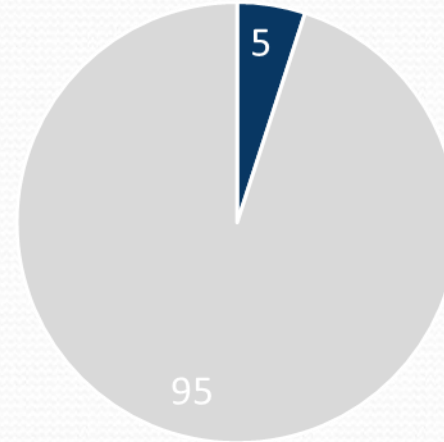


■ 2026 Yılı Tamamlanan ■ Kalan

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ASANSÖR YAPIM İŞİ

- Sözleşme tarihi : 09.04.2026
- İşin başlangıç tarihi : 13.04.2026
- İşin bitim tarihi : 10.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 3.274.800,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)

Asansör kuyu ve yalıtım işleri tamamlanmıştır. Asansör statik inşaat işleri ve asansör işleri devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %20 ve toplam nakdi gerçekleştirme %0 olmuştur.

Gerçekleşme

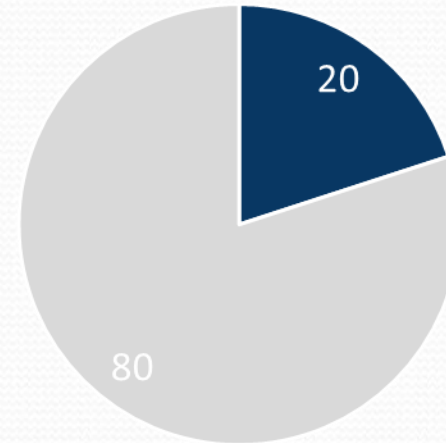


■ 2026 Yılı Tamamlanan ■ Kalan

PLANETARYUM YAPIM İŐİ

- Sözcleşme tarihi : 21.05.2026
- İŐin baŐlangıç tarihi : -
- İŐin bitim tarihi : 01.11.2026
- Toplam sözcleşme bedeli : 10.392.000S,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2025 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)

21.05.2026 tarihinde sözcleşmesi yapılmıŐtır.

Gerçekleşme



■ 2026 Yılı Tamamlanan ■ Kalan

2026 Yılı Devam Eden Projeler

Saęlık Sektörü


ACIL VE YOĐUN BAKIM BİNASI

- Kapalı Alan : 5.480 m²
- Sözleşme tarihi : 31.05.2024
- İşin başlangıç tarihi : 03.06.2024
- İşin bitim tarihi : 11.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 242.897.767,26-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 241.333.702,47-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 37.082.046,87-TL (KDV dahil)



ACIL VE YOĐUN BAKIM BİNASI

Acil Binası bodrum kat ve istinat duvarları betonarme imalatları, bodrum kat perdeleri su yalıtımı ve ısı yalıtımı imalatları, tüm katlar betonarme imalatları, perde betonu yalıtımı ve bodrum kat pis su ve yağmur suyu hattı, çatı teras imalatları, doğrama imalatları, duvar alçı ve sıva imalatları tamamlanmıştır. Seramik imalatları, mekanik ve elektrik tesisat imalatları, geçiş koridoru imalatları devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleştirme %8 artarak toplam fiziki gerçekleştirme %99 ve toplam nakdi gerçekleştirme %99 olmuştur.

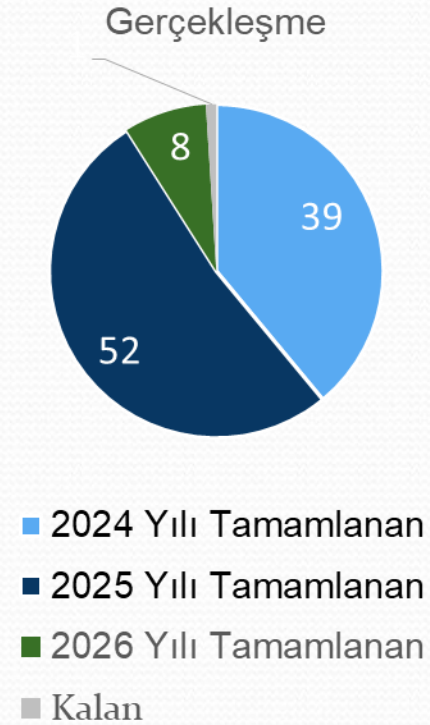

ACIL VE YOĐUN BAKIM BİNASI



HASTANE EK BİNA (KATLI OTOPARK)


- Kapalı Alan : 6.250 m²
- Sözleşme tarihi : 29.09.2025
- İşin başlangıç tarihi : 06.10.2025
- İşin bitim tarihi : 01.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 93.226.358,12-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 55.623.562,67-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 24.011.947,15-TL (KDV dahil)



HASTANE EK BİNA (KATLI OTOPARK)

Kazı imalatları, temel izolasyon imalatları, temel grobeton, raye demir ve temel beton imalatları tamamlanmıştır. 1.kat betonarme imalatları devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerekleşme %24 artarak toplam fiziki gerekleşme %60 ve toplam nakdi gerekleşme %58 olmuştur.

Gerekleşme

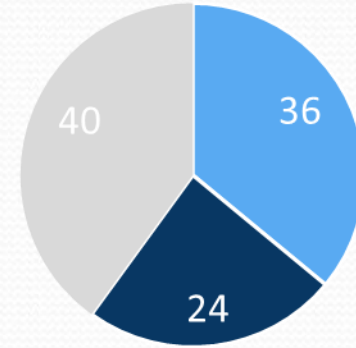

- 2025 Yılı Tamamlanan
- 2026 Yılı Tamamlanan
- Kalan

HASTANE EK BİNA (KATLI OTOYOL)



DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ HASTANESİ BİNASI


- Kapalı Alan : 12.730 m²
- Sözleşme tarihi : 10.11.2025
- İşin başlangıç tarihi : 14.11.2025
- İşin bitim tarihi : 12.03.2028
- Toplam sözleşme bedeli : 540.092.256,70-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 47.722.212,78-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 32.292.627,86-TL (KDV dahil)



DİŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ HASTANESİ BİNASI

Temel kazı imalatları, temel kalıp, grobeton ve yalıtım imalatları tamamlanmıştır. Temel demir ve beton imalatları devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerekleşme %6 artarak toplam fiziki gerekleşme %10 ve toplam nakdi gerekleşme %8 olmuştur.

Gerekleşme

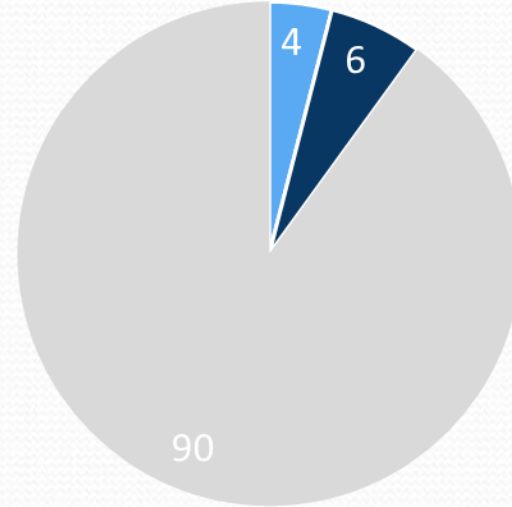

- 2025 Yılı Tamamlanan
- 2026 Yılı Tamamlanan
- Kalan

DIŐ HEKİMLİĐİ FAKÜLTESİ HASTANESİ BİNASI




ARAŐTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 500 kW ATI GES YAPIMI

- Szleşme tarihi : 24.10.205
- İŐin baŐlangıç tarihi : 30.10.2025
- İŐin bitim tarihi : 28.03.2026
- Toplam szleşme bedeli : 17.294.988,99-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar denen tutar : 17.294.988,99-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı iinde denen tutar : 17.294.988,99-TL (KDV dahil)

İŐ tamamlanmıŐ olup; geici kabul aŐamasındadır. 2026 yılı fiziki gerekleşme %5 artarak toplam fiziki gerekleşme %100 ve toplam nakdi gerekleşme %100 olmuŐtur.

Gerekleşme

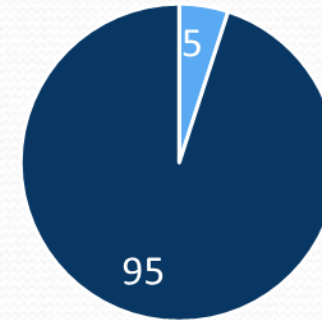

- 2025 Yılı Tamamlanan
- 2026 Yılı Tamamlanan
- Kalan
