



2026 Yılı Devam Eden Projeler


Eğitim Yükseköğretim Sektörü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LABORATUVAR BİNASI ETÜT PROJE İŞİ

- Sözleşme tarihi : 20.04.2026
- İşin başlangıç tarihi : 24.04.2026
- İşin bitim tarihi : 21.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 1.416.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)

Sözleşme imzalanmış, zemin etüt işleri, mimari avan projeleri tamamlanmıştır. Mimari uygulama projeleri ile statik projesi, mekanik ve elektrik avan projeleri devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme % 35 ve toplam nakdi gerçekleştirme %0 olmuştur.

Gerçekleşme

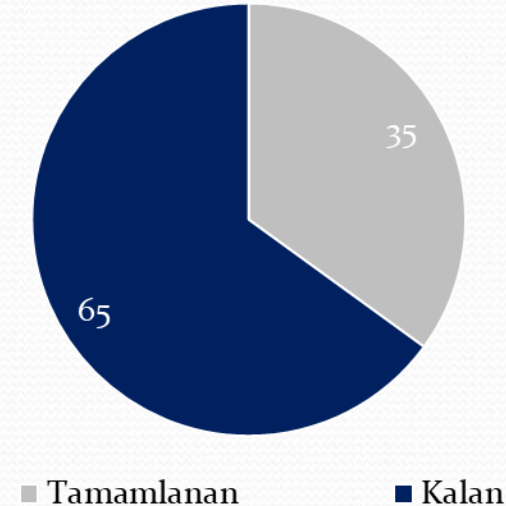


ZİLE MYO ISI MERKEZİ İLE ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO ISI MERKEZİ REVİZYON İŞLERİ

- Sözleşme tarihi : 04.03.2026
- İşin başlangıç tarihi : 09.03.2026
- İşin bitim tarihi : 05.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 3.036.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 3.036.000,00-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 3.036.000,00-TL (KDV dahil)



ZİLE MYO ISI MERKEZİ İLE ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO ISI MERKEZİ REVİZYON İŞLERİ

Zile MYO Isı Merkezi ve Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO mevcut eski kalorifer kazanları ile ekipmanlarının demontajı, hurda mutfak ekipmanlarının demontajı, yeni kaskad sistem yoğunmalı duvar tipi kalorifer kazanlarının ve ekipmanları ile ısıtma tesisat işleri, sıhhi tesisat işleri, elektrik tesisat işleri, doğalgaz tesisat işleri ve baca imalatları tamamlanmıştır. İş tamamlanmış, geçici kabulü yapılmıştır. 2026 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme % 100 ve toplam nakdi gerçekleştirme %100 olmuştur.



ZİLE MYO ISI MERKEZİ İLE ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO ISI MERKEZİ REVİZYON İŞLERİ



SAĞLIK KAMPÜSÜ 1000 TONLUK SU DEPOSU


- Sözleşme tarihi : 17.09.2025
- İşin başlangıç tarihi : 22.09.2025
- İşin bitim tarihi : 17.06.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 21.610.643,35-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 21.610.643,35-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 11.607.331,13-TL (KDV dahil)



SAĞLIK KAMPÜSÜ 1000 TONLUK SU DEPOSU


İş tamamlanmış olup; geçici kabul aşamasındadır. 2026 yılı fiziki gerçekleşme %46 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

Gerçekleşme

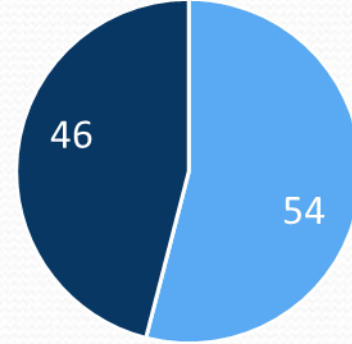

- 2025 Yılı Tamamlanan
- 2026 Yılı Tamamlanan
- Kalan

SAĞLIK KAMPÜSÜ 1000 TONLUK SU DEPOSU

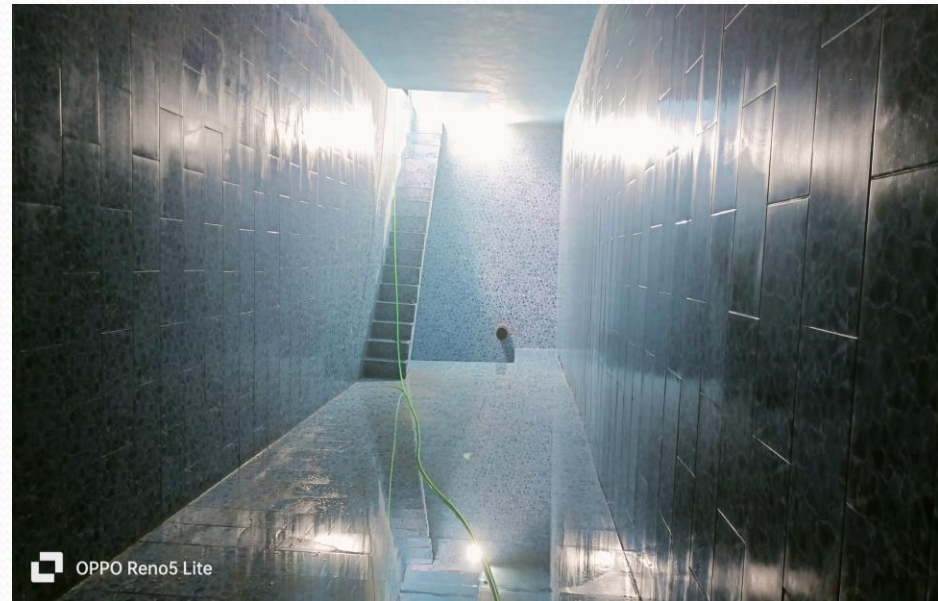

KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI


- Sözleşme tarihi : 01.12.2025
- İşin başlangıç tarihi : 04.12.2025
- İşin bitim tarihi : 10.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 16.498.419,17-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 14.794.930,07-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 11.532.152,91-TL (KDV dahil)



KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI

İslami İlimler Fakültesi kazı imalatları, İslami İlimler Fakültesi beton imalatları, İslami İlimler Fakültesi önü açık spor tesisleri beton imalatları, Mühendislik yolu perde duvar ve yaya yolu tadilat işleri, İslami İlimler Fakültesi yaya yolu Yeni Rektörlük Binası çevre perde duvar sıva imalatlar, basketbol sahası, tamamlanmıştır. Hukuk Fakültesi çevre düzenleme işleri, kamelya işleri, İslami İlimler Fakültesi yaya yolu işleri devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleşme %68 artarak toplam fiziki gerçekleşme %91 ve toplam nakdi gerçekleşme %89 olmuştur.

Gerçekleşme

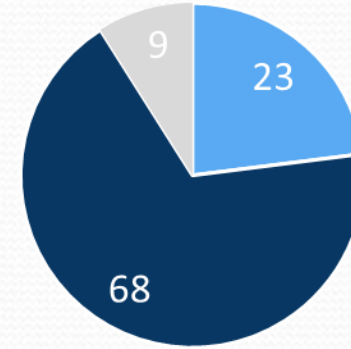

- 2025 Yılı Tamamlanan
- 2026 Yılı Tamamlanan
- Kalan

ERBAA MYO VE REŞADIYE MYO ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ


- Sözleşme tarihi : 07.05.2026
- İşin başlangıç tarihi : 12.05.2026
- İşin bitim tarihi : 09.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 11.280.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 5.971.467,31-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 5.971.467,31-TL (KDV dahil)



ERBAA MYO VE REŞADIYE MYO ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

Erbaa basketbol sahası taban beton imalatları, Reşadiye taş duvar imalatları, Reşadiye çevre imalatları devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %55 ve toplam nakdi gerçekleşme %53 olmuştur.


Gerçekleşme

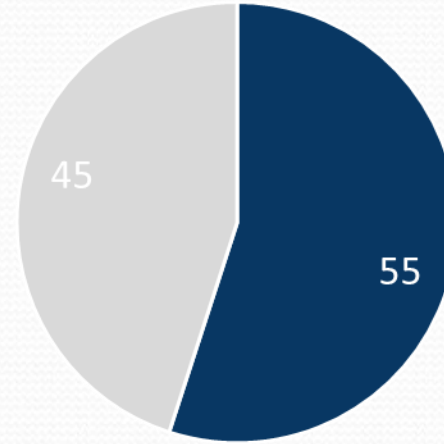

■ 2026 Yılı Tamamlanan ■ Kalan


FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ASANSÖR YAPIM İŞİ

- Sözleşme tarihi : 09.04.2026
- İşin başlangıç tarihi : 13.04.2026
- İşin bitim tarihi : 10.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 3.274.800,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 2.078.999,78-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 2.078.999,78-TL (KDV dahil)

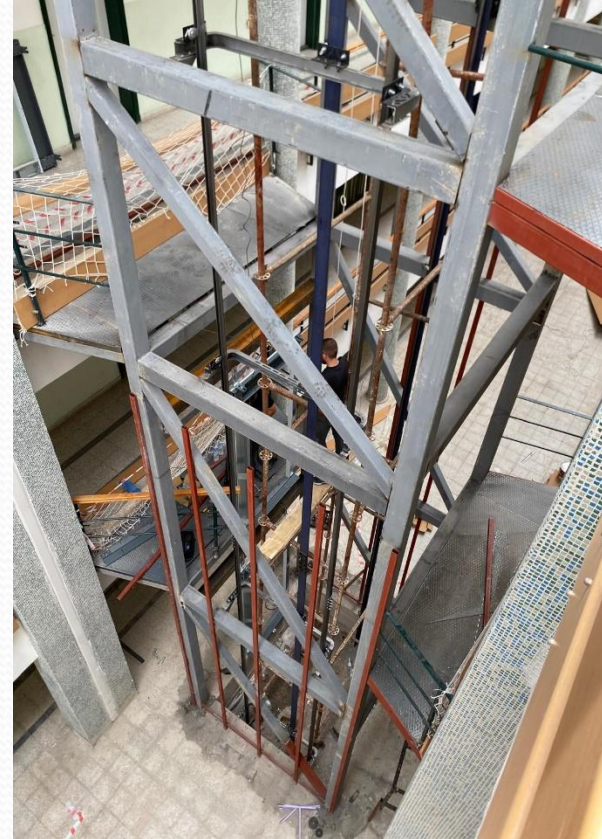

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ASANSÖR YAPIM İŞİ

Asansör kuyu ve yalıtım işleri, çelik konstrüksiyon işleri ve asansör kapı montaj işleri tamamlanmıştır. Asansör inşaat, elektrik ve montaj işleri devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %67 ve toplam nakdi gerçekleşme %64 olmuştur.

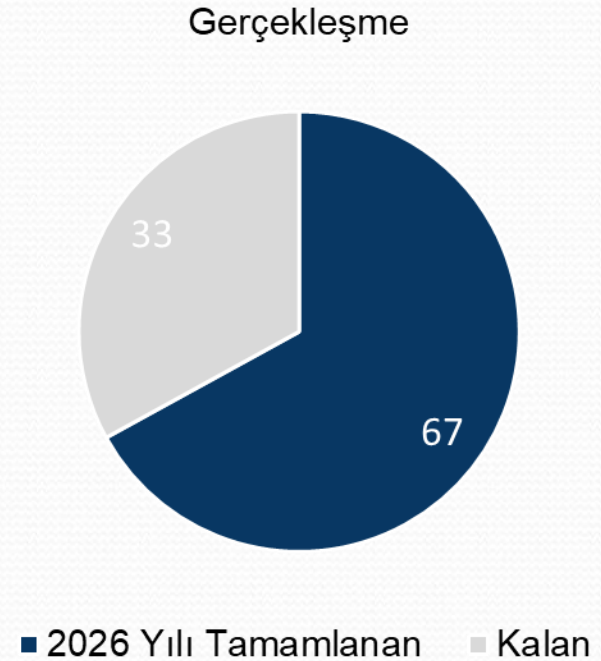


PLANETARYUM YAPIM İŞİ

- Sözleşme tarihi : 21.05.2026
- İşin başlangıç tarihi : 04.06.2026
- İşin bitim tarihi : 31.10.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 10.392.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)



PLANETARYUM YAPIM İŞİ

Temel kazı ve yalıtım, temel kalıp ve demir imalatları ile topraklama imalatları tamamlanmıştır. Kalıp demir ve inşaat işleri devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %15 ve toplam nakdi gerçekleşme %0 olmuştur.

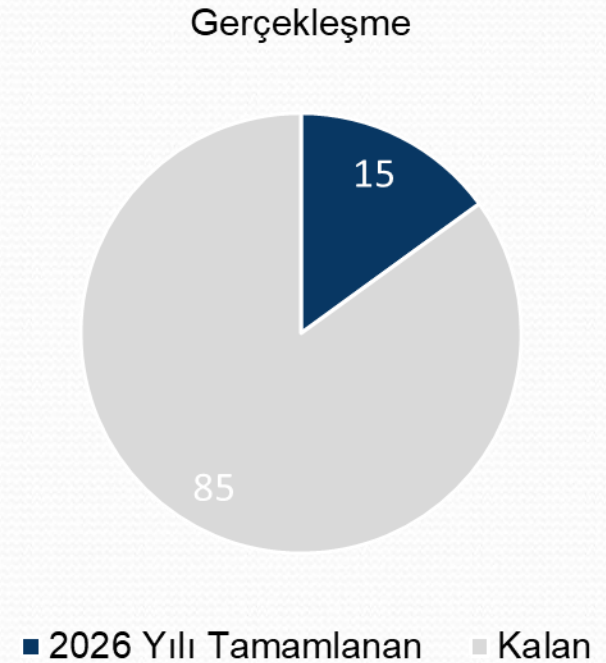

PLANETARYUM YAPIM İŞİ



MERKEZİ KAFETERYA BULAŞIKHANE ONARIM İŞİ


- Sözleşme tarihi : 04.06.2026
- İşin başlangıç tarihi : 05.06.2026
- İşin bitim tarihi : 02.09.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 5.844.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 2.798.507,39-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 2.798.507,39-TL (KDV dahil)



MERKEZİ KAFETERYA BULAŞIKHANE ONARIM İŞİ


Klima, davlumbaz ve bulaşık yıkama makinası montaj işleri, doğalgaz tesisat işleri, depo duvar imalatları ve koridor duvar seramik imalatları tamamlanmıştır. İnşaat, mekanik ve elektrik tesisat işleri devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %51 ve toplam nakdi gerçekleşme %48 olmuştur.

Gerçekleşme

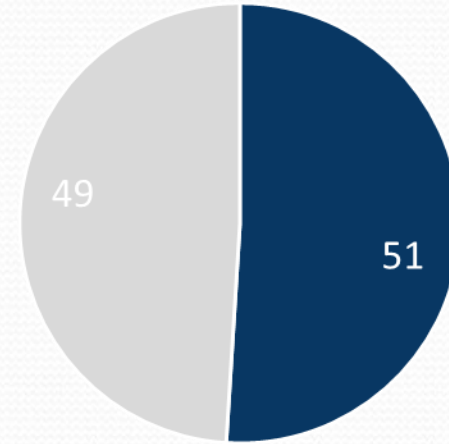

■ 2026 Yılı Tamamlanan ■ Kalan

MERKEZİ KAFETERYA BULAŞIKHANE ONARIM İŞİ

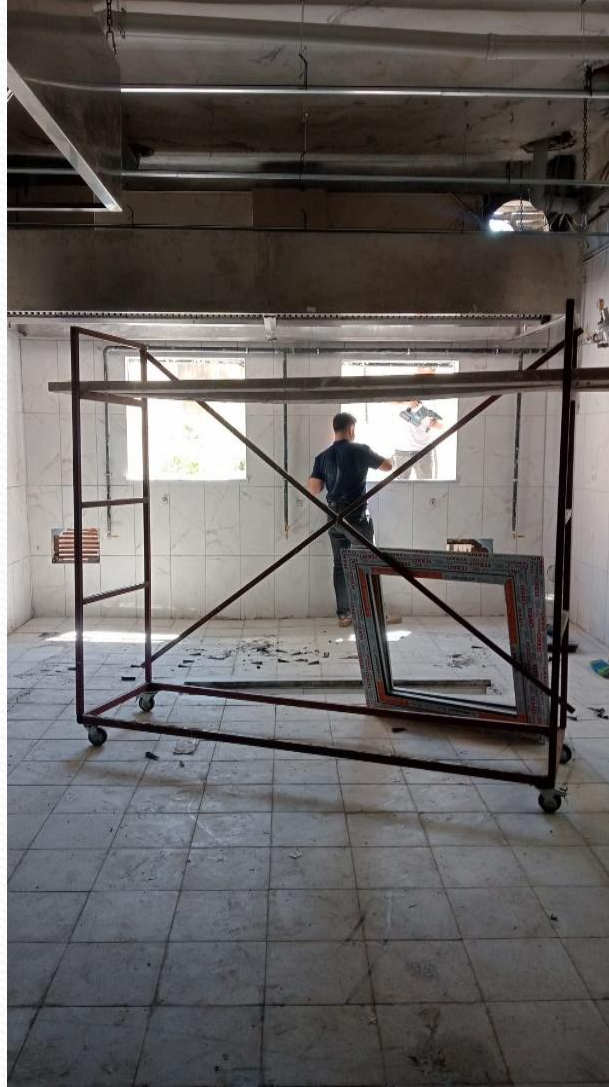

MERKEZİ LABORATUVAR ÇATI YAPIMI İŞİ


- Sözleşme tarihi : 10.06.2026
- İşin başlangıç tarihi : 17.06.2026
- İşin bitim tarihi : 14.10.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 4.115.314,80-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 1.689.207,98-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 1.689.207,98-TL (KDV dahil)



MERKEZİ LABORATUVAR ÇATI YAPIMI İŞİ

Çatı üzerindeki söküm ve demontaj işleri, 3 kısım çatının ahşap oturtma ve kaplama işleri tamamlandı. Çatı üzeri membran, oluk ve trapez imalatları devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %43 ve toplam nakdi gerçekleşme %41 olmuştur.

Gerçekleşme

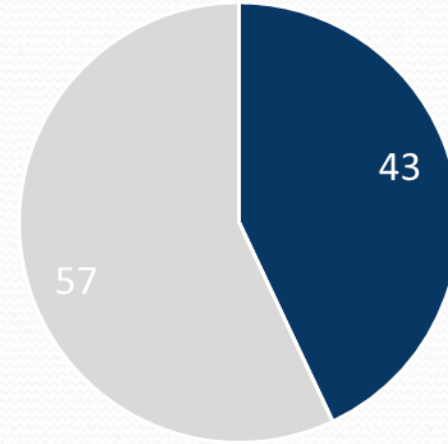

■ 2026 Yılı Tamamlanan ■ Kalan

MERKEZİ LABORATUVAR ÇATI YAPIMI İŞİ




TIP FAKÜLTESİ BECERİ LABORATUVARI YAPIMI İŞİ

- Sözleşme tarihi : 08.07.2026
- İşin başlangıç tarihi : 08.07.2026
- İşin bitim tarihi : 20.09.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 4.476.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)

08.07.2026 tarihinde işyeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2026 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %5 ve toplam nakdi gerçekleştirme %0 olmuştur.

Gerçekleşme

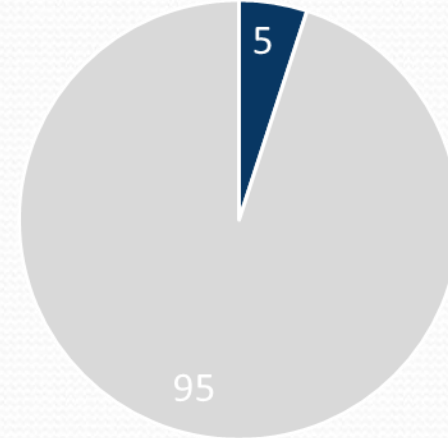

■ 2026 Yılı Tamamlanan ■ Kalan



2026 Yılı Devam Eden Projeler

Sağlık Sektörü

ACİL VE YOĞUN BAKIM BİNASI


- Kapalı Alan : 5.480 m²
- Sözleşme tarihi : 31.05.2024
- İşin başlangıç tarihi : 03.06.2024
- İşin bitim tarihi : 11.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 244.346.363,99-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 244.346.363,99-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 40.094.719,39-TL (KDV dahil)



ACİL VE YOĞUN BAKIM BİNASI

İnşaat tamamlanmış olup; geçici kabul aşamasındadır. 2026 yılı fiziki gerçekleşme %9 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

Gerçekleşme

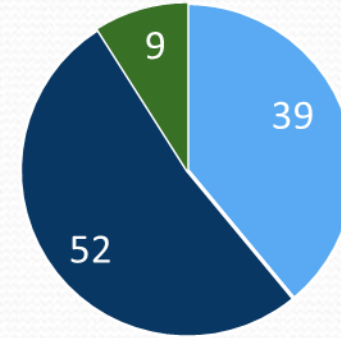

- 2024 Yılı Tamamlanan
- 2025 Yılı Tamamlanan
- 2026 Yılı Tamamlanan
- Kalan

ACİL VE YOĞUN BAKIM BİNASI



HASTANE EK BİNA (KATLI OTOPARK)


- Kapalı Alan : 6.250 m²
- Sözleşme tarihi : 29.09.2025
- İşin başlangıç tarihi : 06.10.2025
- İşin bitim tarihi : 01.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 94.983.593,99-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 66.938.497,98-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 35.326.882,45-TL (KDV dahil)



HASTANE EK BİNA (KATLI OTOPARK)

Kazı imalatları, temel izolasyon imalatları, temel grobeton, radye demir ve temel beton imalatları, 1.kat betonarme imalatları tamamlanmıştır. Bina kenar dolgu işleri, zemin kat parapet imalatları devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerekleşme %35 artarak toplam fiziki gerekleşme %71 ve toplam nakdi gerekleşme %69 olmuştur.

Gerekleşme

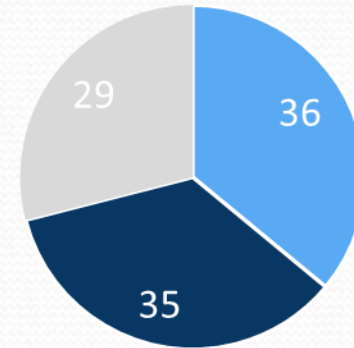

- 2025 Yılı Tamamlanan
- 2026 Yılı Tamamlanan
- Kalan

HASTANE EK BİNA (KATLI OTOYOL)



DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ BİNASI


- Kapalı Alan : 12.730 m²
- Sözleşme tarihi : 10.11.2025
- İşin başlangıç tarihi : 14.11.2025
- İşin bitim tarihi : 12.03.2028
- Toplam sözleşme bedeli : 545.432.736,07-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 91.443.663,46-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 76.014.078,55-TL (KDV dahil)



DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ BİNASI

B Blok zemin kat kolonları ve demir imalatları, B, C, D Blok bodrum kat kolon, perde duvar, kiriş ve döşeme imalatları, A Blok bodrum kat kolon, perde duvar imalatları, bina bodrum kat su izolasyon imalatları tamamlanmıştır. A Blok bodrum kat kiriş ve döşeme kalıp demir imalatları, bina pis su ve drenaj hattı imalatları, bina çevre kazı dolgu imalatları devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleşme %13 artarak toplam fiziki gerçekleşme %17 ve toplam nakdi gerçekleşme %15 olmuştur.

Gerçekleşme

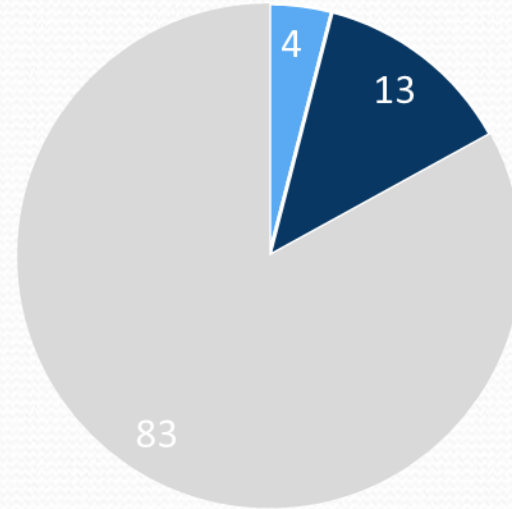

■ 2025 Yılı Tamamlanan ■ 2026 Yılı Tamamlanan
■ Kalan

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ BİNASI




ARAřTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 500 kW ATI GES YAPIMI

- Szleşme tarihi : 24.10.205
- İřin bařlangıç tarihi : 30.10.2025
- İřin bitim tarihi : 28.03.2026
- Toplam szleşme bedeli : 17.294.988,99-TL (KDV dahil)
- Bugne kadar denen tutar : 17.294.988,99-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı iinde denen tutar : 17.294.988,99-TL (KDV dahil)

İř tamamlanmıř olup; geici kabul yapılmıřtır. 2026 yılı fiziki gerekleşme %5 artarak toplam fiziki gerekleşme %100 ve toplam nakdi gerekleşme %100 olmuřtur.

Gerekleşme

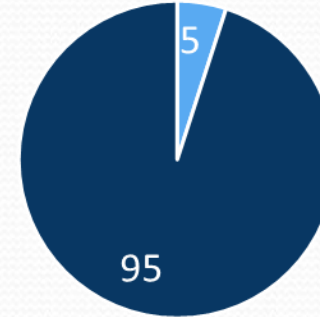

- 2025 Yılı Tamamlanan
- 2026 Yılı Tamamlanan
- Kalan
