



2024 Yılı Devam Eden Projeler

Eđitim Y¼ksek¼đretim Sekt¼r¼

SULUSARAY FTR JENERATÖR YAPIM İŐİ


- Sözlēme tarihi : 01.04.2024
- İŐin baŐlangıç tarihi : 05.04.2024
- İŐin bitim tarihi : 03.07.2024
- Toplam sözlēme bedeli : 7.843.778,62-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 7.843.778,62-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar :7.843.778,62-TL (KDV dahil)



SULUSARAY FTR JENERATÖR YAPIM İŞİ

Köşk yeri kazısı, topraklama, beton imalatları, pano imalatları, köşk ve pano yerleşimi işleri, jeneratör imalatı ve yerleşimi tamamlanmış olup iş geçici kabul aşamasındadır. 2024 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %100 ve toplam nakdi gerçekleştirme %100 olmuştur.

Gerçekleşme

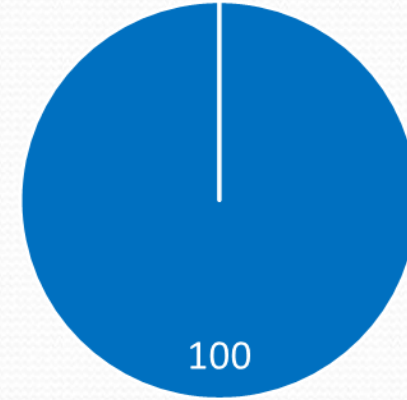

■ Tamamlanan ■ Kalan

TÖMER BİNASI ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ


- Sözleşme tarihi : 15.04.2024
- İşin başlangıç tarihi : 19.04.2024
- İşin bitim tarihi : 16.10.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 5.851.759,82-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 4.620.689,04-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 4.620.689,04-TL (KDV dahil)



TÖMER BİNASI ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

Çevre aydınlatma direk yerleri, kablolama ve kazı işleri, ön beton saha imalatları, arka beton saha imalatları, toprak dolgu imalatları tamamlanmıştır. Çevre imalatları ve kamelya yapımı devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %88 ve toplam nakdi gerçekleştirme %79 olmuştur.

Gerçekleşme

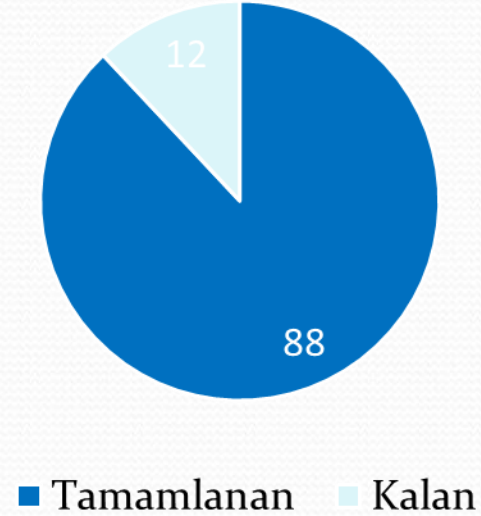

MEYVE KURUTMA TESİSİ YAPIMI


- Sözleşme tarihi : 27.08.2024
- İşin başlangıç tarihi : 29.08.2024
- İşin bitim tarihi : 27.09.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 713.530,99-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 713.530,99-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 713.530,99-TL (KDV dahil)



MEYVE KURUTMA TESİSİ YAPIMI

İş tamamlanmış olup; geçici kabul aşamasındadır. 2024 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %100 ve toplam nakdi gerçekleştirme %100 olmuştur.

Gerçekleşme

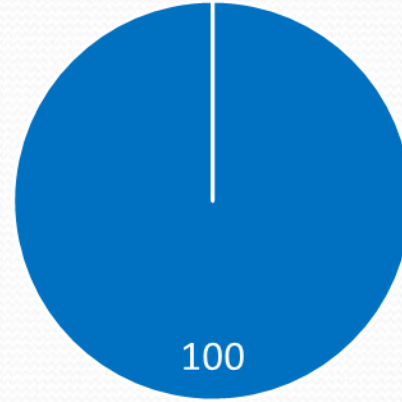


■ Tamamlanan ■ Kalan

REKTÖRLÜK BİNASI ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

- Sözleşme tarihi : 26.09.2024
- İşin başlangıç tarihi : 01.10.2024
- İşin bitim tarihi : 29.11.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 18.942.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)

İş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2024 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %2 ve toplam nakdi gerçekleştirme %0 olmuştur.

Gerçekleşme

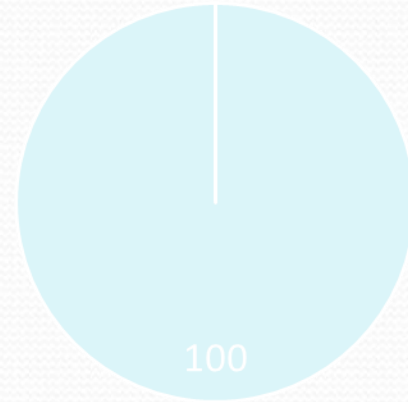

■ Tamamlanan ■ Kalan

TÖMER BİNASI İNŞAATI

- Kapalı Alan : 3.902 m²
- Sözleşme tarihi : 24.06.2022
- İşin başlangıç tarihi : 29.06.2022
- İşin bitim tarihi : 05.09.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 39.637.818,70-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 39.637.818,70-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 7.919.112,63-TL (KDV dahil)




TÖMER BİNASI İNŞAATI

İnşaat tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır. 2024 yılı fiziki gerçekteşme %11 artarak toplam fiziki gerçekteşme %100 ve toplam nakdi gerçekteşme %100 olmuştur.

İnşaat

Gerçekteşme

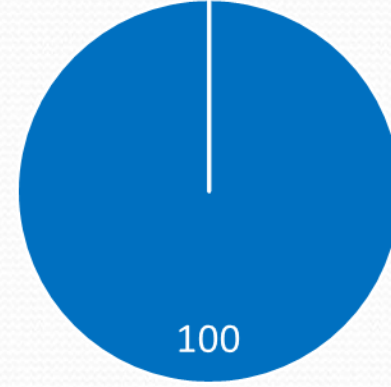

■ Tamamlanan ■ Kalan

TÖMER BİNASI İNŞAATI



TIP FAKÜLTESİ AMFİ BİNASI İNŞAATI


- Kapalı Alan :8.603 m²
- Sözleşme tarihi : 04.08.2022
- İşin başlangıç tarihi : 08.08.2022
- İşin bitim tarihi : 15.10.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 101.212.483,45-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 97.089.419,73-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 41.461.296,84-TL (KDV dahil)



TIP FAKÜLTESİ AMFİ BİNASI İNŞAATI


Kazı dolgu işleri, tesisat odası karo mozaik imalatı ve duvar seramik imalatı, A, B ve C blok tuğla duvar imatları, A, B ve C blok kaba sıva ve alçı sıva imatları, A, B ve C blok demir, kalıp, beton imatları, bina çevre dolgu imatları, kazan dairesi kaskat imatları, A,B ve C blokların dış cephe tuğla kaplama imatları tamamlanmıştır. A, B ve C blok seramik imatları, doğrama imatları, kablo tava imatları, asma tavan imatları, mekanik tesisat imatları, A,B ve C blokların asansör imatları devam etmektedir. 2024 Yılı fiziki gerçekteşme %25 artarak toplam fiziki gerçekteşme %95 ve toplam nakdi gerçekteşme %93 olmuştur.

Gerçekteşme

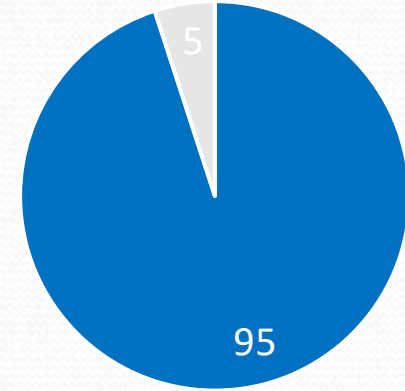

■ Tamamlanan ■ Kalan

TIP FAKÜLTESİ AMFİ BİNASI İNŞAATI

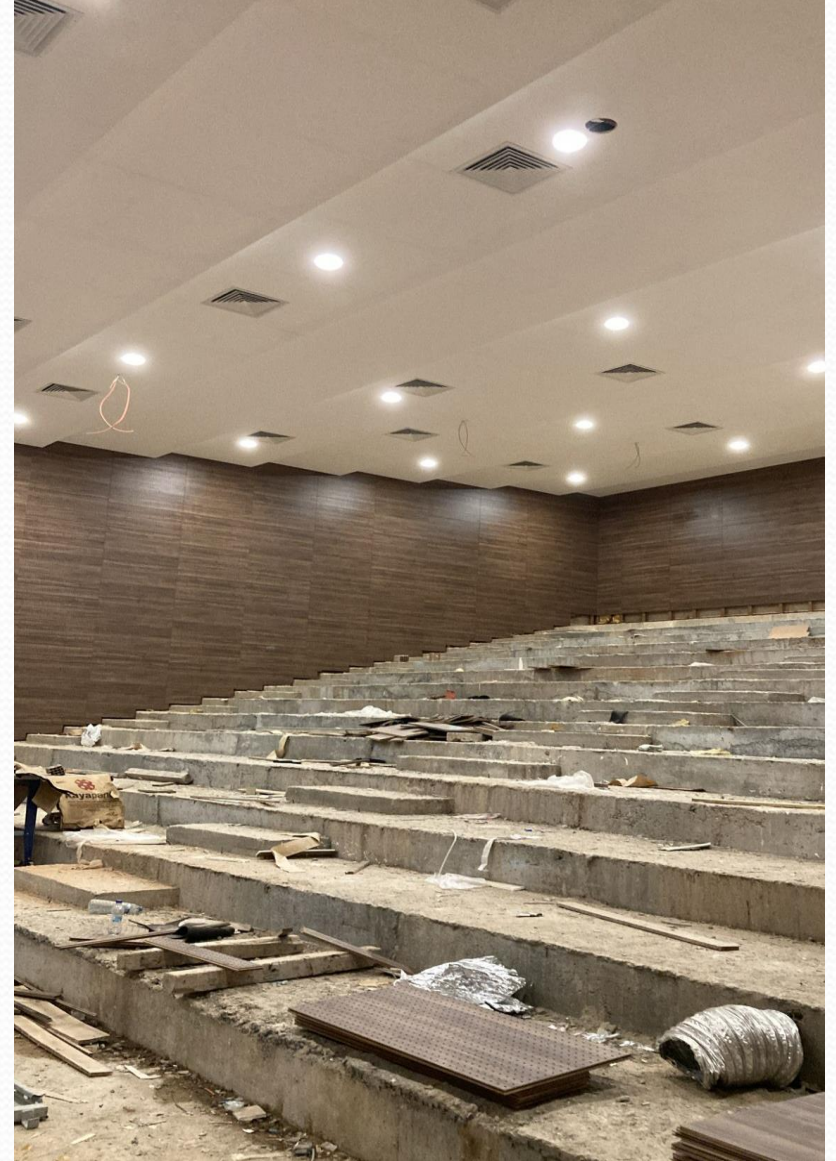

REKTÖRLÜK BİNASI İNŞAATI


- Kapalı Alan : 10.307 m²
- Sözleşme tarihi : 01.09.2022
- İşin başlangıç tarihi : 06.09.2022
- İşin bitim tarihi : 10.11.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 120.727.845,15-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 118.339.342,33-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 41.618.313,89-TL (KDV dahil)



REKTÖRLÜK BİNASI İNŞAATI

A ve B blok betonarme imalatları, tuğla duvar imalatları, çatı imalatları, kaba sıva imalatları, A ve B blok alçı sıva imalatları, A ve B blok alüminyum imalatları, A blok merdiven kaplama imalatları, A ve B blok yangın kapı imalatları A ve B blok döşeme imalatları, A ve B blokların asma tavan imatları, A ve B blok kapı imatları tamamlanmıştır. Mekanik tesisat ve elektrik tesisat imatları devam etmektedir. 2024 Yılı fiziki gerçekteşme %17 artarak toplam fiziki gerçekteşme %97 ve toplam nakdi gerçekteşme %95 olmuştur.

Gerçekteşme

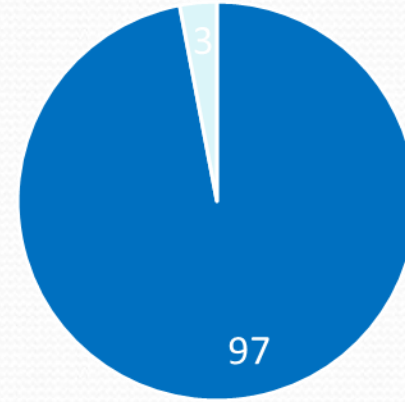

■ Tamamlanan ■ Kalan

REKTÖRLÜK BİNASI İNŞAATI



HUKUK FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI


- Kapalı Alan : 10.244 m²
- Sözleşme tarihi : 08.12.2023
- İşin başlangıç tarihi : 12.12.2023
- İşin bitim tarihi : 10.11.2025
- Toplam sözleşme bedeli : 153.565.757,19-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 74.919.291,47-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 74.919.291,47-TL (KDV dahil)



HUKUK FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI

B blok betonarme imalatları, temel, kazı dolgu imalatları tamamlanmıştır. A blok betonarme imalatları ve B blok duvar imalatları, havalandırma tesisat işleri ve elektrik tesisat işleri devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %47 ve toplam nakdi gerçekleşme %44 olmuştur.

Gerçekleşme

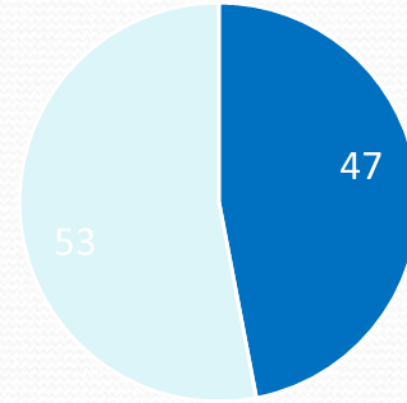

■ Tamamlanan ■ Kalan

HUKUK FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI



ESKİ MUTFAK BİNASI TADİLAT VE ONARIM İŞİ


- Sözleşme tarihi : 04.04.2024
- İşin başlangıç tarihi : 15.04.2024
- İşin bitim tarihi : 10.09.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 3.539.126,30-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 3.539.126,30-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 3.539.126,30-TL (KDV dahil)



ESKİ MUTFAK BİNASI TADİLAT VE ONARIM İŞİ

İş tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır. 2024 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %100 ve toplam nakdi gerçekleştirme %100 olmuştur

Gerçekleşme

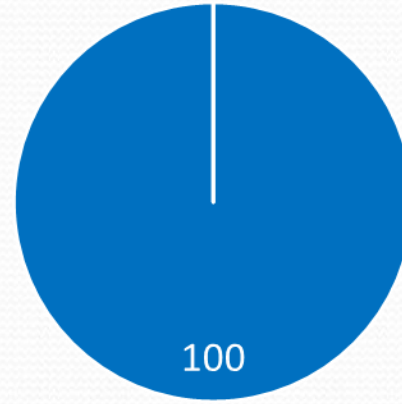

■ Tamamlanan ■ Kalan

ESKİ MUTFAK BİNASI TADİLAT VE ONARIM İŞİ



REKTÖRLÜK, ENSTİTÜLER, FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR 2024 YILI BÜYÜK ONARIM İNŞAATI


- Sözleşme tarihi : 14.08.2024
- İşin başlangıç tarihi : 15.08.2024
- İşin bitim tarihi : 28.10.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 1.963.200,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 912.341,41-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 912.341,41-TL (KDV dahil)



REKTÖRLÜK, ENSTİTÜLER, FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR 2024 YILI BÜYÜK ONARIM İNŞAATI

Artova MYO güvenlik filesi yapımı, Erbaa MYO lama ve profil demirden çeşitli demir işleri, alçı levhalar ile asma tavan imalatı ve bölme duvar imalatları tamamlanmıştır. Erbaa MYO kütüphane elektrik montaj işleri devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %52 ve toplam nakdi gerçekleştirme %46 olmuştur

Gerçekleşme

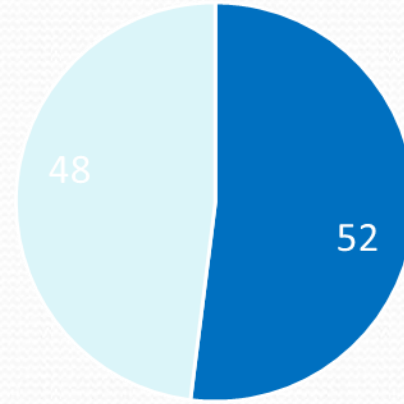

■ Tamamlanan ■ Kalan

REKTÖRLÜK, ENSTİTÜLER, FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR 2024 YILI BÜYÜK ONARIM İNŞAATI




ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİLİĞİ SOLAR KURUTMA ÜNİTESİ YAPIMI

- Sözleşme tarihi : 27.09.2024
- İşin başlangıç tarihi : 30.10.2024
- İşin bitim tarihi : 13.12.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 1.743.600,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)

İş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2024 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %0 ve toplam nakdi gerçekleştirme %0 olmuştur.

Gerçekleşme



■ Tamamlanan ■ Kalan

2024 Yılı Devam Eden Projeler

Saęlık Sektörü

ACIL VE YOĐUN BAKIM BİNASI


- Kapalı Alan : 5.480 m²
- Sözleşme tarihi : 31.05.2024
- İşin başlangıç tarihi : 03.06.2024
- İşin bitim tarihi : 11.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 176.040.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 12.958.333,92-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 12.958.333,92-TL (KDV dahil)



ACIL VE YOĐUN BAKIM BİNASI

Acil Binasının ve Tip1, Tip12, Tip13 istinat duvarlarının betonarme imalatları, Acil Binasının bodrum kat perde ve kolonların betonarme imalatları tamamlanmıştır. Acil Binasının duvar altı hatıllarının beton ve kalıp işleri, perde beton yalıtım imalatları devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerekleşme ile toplam fiziki gerekleşme %11 ve toplam nakdi gerekleşme %9 olmuştur.

Gerekleşme

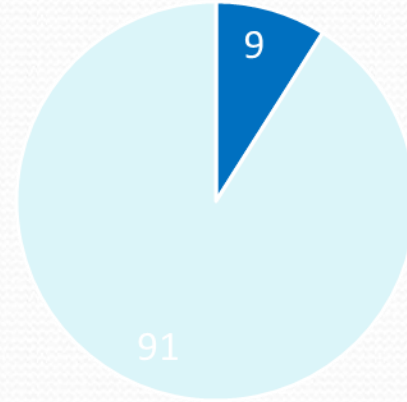

■ Tamamlanan ■ Kalan

ACİL VE YOĞUN BAKIM BİNASI



SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ OTOMATİK DÖNER KAPI YAPIMI


- Sözleşme tarihi : 13.09.2024
- İşin başlangıç tarihi : 16.09.2024
- İşin bitim tarihi : 14.11.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 560.999,93-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)



SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ OTOMATİK DÖNER KAPI YAPIMI

İş tamamlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır. 2024 yılı fiziki gerçekleştirme ile toplam fiziki gerçekleştirme %100 ve toplam nakdi gerçekleştirme %0 olmuştur

Gerçekleşme

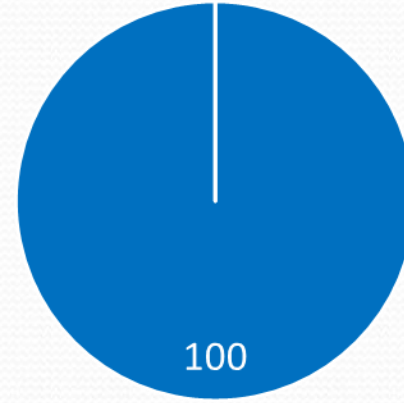

■ Tamamlanan ■ Kalan
