



2024 Yılı Devam Eden Projeler

Eğitim Yükseköğretim Sektörü

SULUSARAY FTR JENERATÖR YAPIM İŞİ


- Sözleşme tarihi : 01.04.2024
- İşin başlangıç tarihi : 05.04.2024
- İşin bitim tarihi : 03.07.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 7.843.778,62-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 7.843.778,62-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 7.843.778,62-TL (KDV dahil)



SULUSARAY FTR JENERATÖR YAPIM İŞİ

Köşk yeri kazısı, topraklama, beton imalatları, pano imalatları, köşk ve pano yerleşimi işleri, jeneratör imalatı ve yerleşimi tamamlanmış olup iş geçici kabul aşamasındadır. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

Gerçekleşme

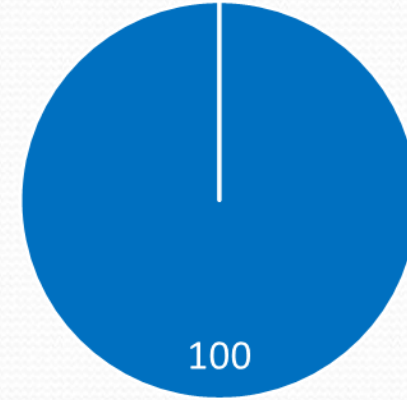

■ Tamamlanan ■ Kalan

TÖMER BİNASI ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ


- Sözleşme tarihi : 15.04.2024
- İşin başlangıç tarihi : 19.04.2024
- İşin bitim tarihi : 16.10.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 5.914.164,14-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 5.914.164,14-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 5.914.164,14-TL (KDV dahil)



TÖMER BİNASI ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

Çevre aydınlatma direk yerleri, kablolama ve kazı işleri, ön beton saha imalatları, arka beton saha imalatları, toprak dolgu imalatları, çevre imalatları ve kamelya imalatları tamamlanmıştır. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

Gerçekleşme

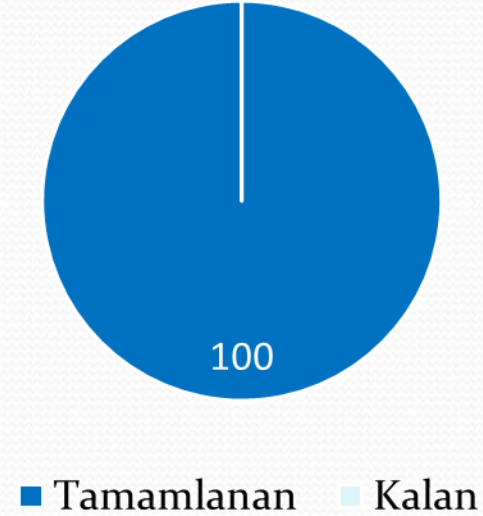

MEYVE KURUTMA TESİSİ YAPIMI


- Sözleşme tarihi : 27.08.2024
- İşin başlangıç tarihi : 29.08.2024
- İşin bitim tarihi : 27.09.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 713.530,99-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 713.530,99-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 713.530,99-TL (KDV dahil)



MEYVE KURUTMA TESİSİ YAPIMI

İş tamamlanmış olup; geçici kabul aşamasındadır. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

Gerçekleşme

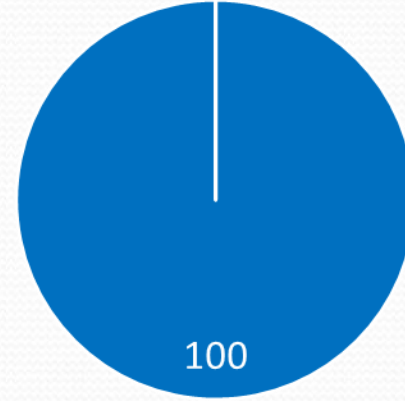

■ Tamamlanan ■ Kalan


REKTÖRLÜK BİNASI ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

- Sözleşme tarihi : 26.09.2024
- İşin başlangıç tarihi : 01.10.2024
- İşin bitim tarihi : 29.11.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 18.942.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 9.767.807,89-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 9.767.807,89-TL (KDV dahil)



REKTÖRLÜK BİNASI ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

Kapalı otopark imalatları, kutu menfez imalatları, bina arka kısım istinat perde duvar imalatları, havuz perdeleri ve havuz elektrik kablolama imalatları tamamlanmıştır. Havuz imalatları, perde imalatları, bordür imalatları ve çevre aydınlatma elektrik imalatları devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme % 55 ve toplam nakdi gerçekleşme % 52 olmuştur.

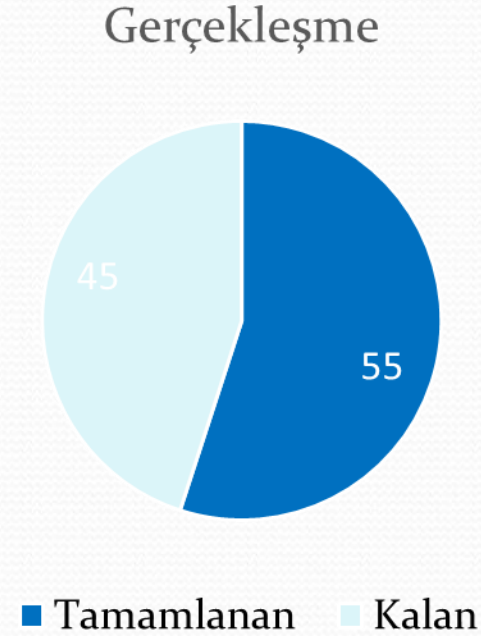

REKTÖRLÜK BİNASI ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ



TÖMER BİNASI İNŞAATI

- Kapalı Alan : 3.902 m²
- Sözleşme tarihi : 24.06.2022
- İşin başlangıç tarihi : 29.06.2022
- İşin bitim tarihi : 05.09.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 39.637.818,70-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 39.637.818,70-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 7.919.112,63-TL (KDV dahil)




TÖMER BİNASI İNŞAATI

İnşaat tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır. 2024 yılı fiziki gerekleşme %11 artarak toplam fiziki gerekleşme %100 ve toplam nakdi gerekleşme %100 olmuştur.

İnşaat

Gerekleşme



■ Tamamlanan ■ Kalan

TÖMER BİNASI İNŞAATI



TIP FAKÜLTESİ AMFİ BİNASI İNŞAATI


- Kapalı Alan :8.603 m²
- Sözleşme tarihi : 04.08.2022
- İşin başlangıç tarihi : 08.08.2022
- İşin bitim tarihi : 19.12.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 104.038.433,79-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 101.442.983,55-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 45.814.860,66-TL (KDV dahil)



TIP FAKÜLTESİ AMFİ BİNASI İNŞAATI

Kazı dolgu işleri, tesisat odası karo mozaik imalatı ve duvar seramik imalatı, A, B ve C blok tuğla duvar imatları, A, B ve C blok kaba sıva ve alçı sıva imatları, A, B ve C blok demir, kalıp, beton imatları, bina çevre dolgu imatları, kazan dairesi kaskat imatları, A,B ve C blokların dış cephe tuğla kaplama imatları tamamlanmıştır. A, B ve C blok seramik imatları, doğrama imatları, kablo tava imatları, asma tavan imatları, mekanik tesisat imatları, A,B ve C blokların asansör imatları devam etmektedir. 2024 Yılı fiziki gerçekteşme %27 artarak toplam fiziki gerçekteşme %97 ve toplam nakdi gerçekteşme %96 olmuştur.

Gerçekteşme

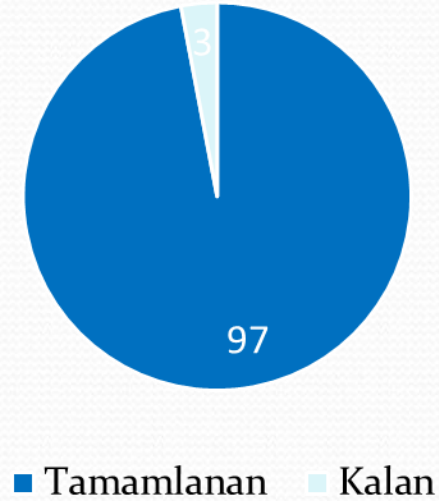

TIP FAKÜLTESİ AMFİ BİNASI İNŞAATI



REKTÖRLÜK BİNASI İNŞAATI


- Kapalı Alan : 10.307 m²
- Sözleşme tarihi : 01.09.2022
- İşin başlangıç tarihi : 06.09.2022
- İşin bitim tarihi : 10.11.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 125.620.766,34-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 125.314.607,22-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 48.593.578,77-TL (KDV dahil)



REKTÖRLÜK BİNASI İNŞAATI

Tüm imalatlar tamamlanmış olup; iş geçici kabul aşamasındadır. 2024 Yılı fiziki gerçekleşme %20 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %99 olmuştur.

Gerçekleşme

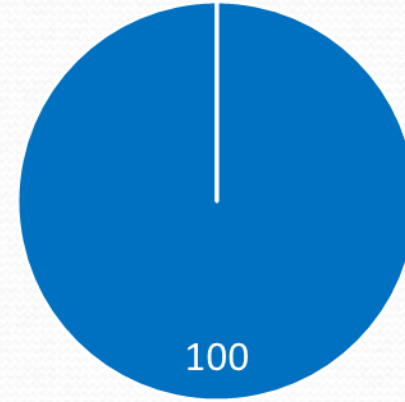

■ Tamamlanan ■ Kalan

REKTÖRLÜK BİNASI İNŞAATI



HUKUK FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI


- Kapalı Alan : 10.244 m²
- Sözleşme tarihi : 08.12.2023
- İşin başlangıç tarihi : 12.12.2023
- İşin bitim tarihi : 10.11.2025
- Toplam sözleşme bedeli : 156.574.903,51-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 87.382.058,13-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 87.382.058,13-TL (KDV dahil)



HUKUK FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI

B blok betonarme imalatları, temel, kazı dolgu imalatları tamamlanmıştır. A blok betonarme imalatları ve B blok duvar imalatları, havalandırma tesisat işleri ve elektrik tesisat işleri devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekteşme ile toplam fiziki gerçekteşme %53 ve toplam nakdi gerçekteşme %51 olmuştur.

Gerçekteşme

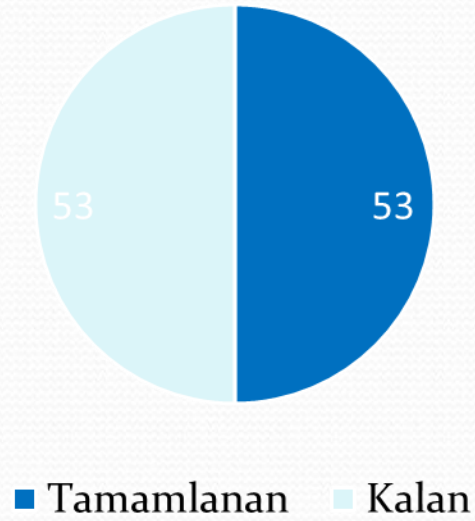

HUKUK FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATI



ESKİ MUTFAK BİNASI TADİLAT VE ONARIM İŞİ


- Sözleşme tarihi : 04.04.2024
- İşin başlangıç tarihi : 15.04.2024
- İşin bitim tarihi : 10.09.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 3.539.126,30-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 3.539.126,30-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 3.539.126,30-TL (KDV dahil)



ESKİ MUTFAK BİNASI TADİLAT VE ONARIM İŞİ

İş tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır. 2024 yılı fiziki gerekleşme ile toplam fiziki gerekleşme %100 ve toplam nakdi gerekleşme %100 olmuştur

Gerekleşme

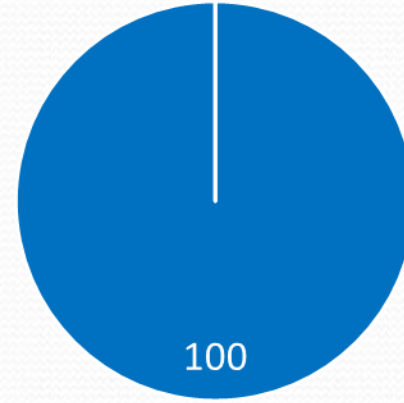

■ Tamamlanan ■ Kalan

ESKİ MUTFAK BİNASI TADİLAT VE ONARIM İŞİ



REKTÖRLÜK, ENSTİTÜLER, FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR 2024 YILI BÜYÜK ONARIM İNŞAATI


- Sözleşme tarihi : 14.08.2024
- İşin başlangıç tarihi : 15.08.2024
- İşin bitim tarihi : 28.10.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 2.145.462,79-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 2.145.462,79-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 2.145.462,79-TL (KDV dahil)



REKTÖRLÜK, ENSTİTÜLER, FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR 2024 YILI BÜYÜK ONARIM İNŞAATI

Artova MYO güvenlik filesi yapımı, Erbaa MYO lama ve profil demirden çeşitli demir işleri, alçı levhalar ile asma tavan imalatı ve bölme duvar imalatları, Erbaa MYO kütüphane elektrik montaj işleri tamamlanmış olup; işin geçici kabulü yapılmıştır. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur

Gerçekleşme

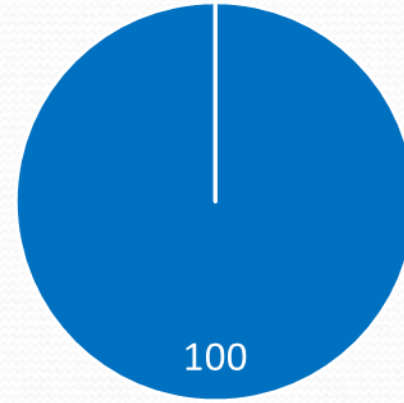

■ Tamamlanan ■ Kalan

REKTÖRLÜK, ENSTİTÜLER, FAKÜLTELER, YÜKSEKOKULLAR 2024 YILI BÜYÜK ONARIM İNŞAATI




ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİLİĞİ SOLAR KURUTMA ÜNİTESİ YAPIMI

- Sözleşme tarihi : 27.09.2024
- İşin başlangıç tarihi : 30.10.2024
- İşin bitim tarihi : 22.11.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 1.822.398,17-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)

Çelik konstrüksiyon imalat işleri devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %25 ve toplam nakdi gerçekleşme %0 olmuştur.

Gerçekleşme

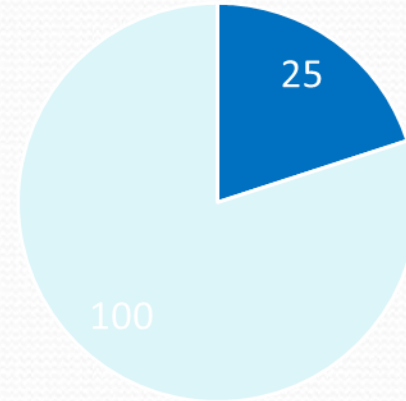


■ Tamamlanan ■ Kalan

ESLİ MUTFAK BİNASI SÜT İŞLEME TESİSİ DÖNÜŞÜMÜ İŞİ

- Sözleşme tarihi : 22.11.2024
- İşin başlangıç tarihi : 26.11.2024
- İşin bitim tarihi : 25.12.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 4.947.600,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)

İş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %0 ve toplam nakdi gerçekleşme %0 olmuştur.

Gerçekleşme

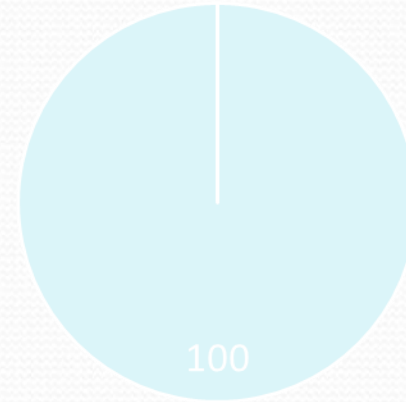

■ Tamamlanan ■ Kalan



2024 Yılı Devam Eden Projeler

Sağlık Sektörü

ACİL VE YOĞUN BAKIM BİNASI


- Kapalı Alan : 5.480 m²
- Sözleşme tarihi : 31.05.2024
- İşin başlangıç tarihi : 03.06.2024
- İşin bitim tarihi : 11.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 178.063.425,08-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 29.564.900,01-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 29.564.900,01-TL (KDV dahil)



ACIL VE YOĞUN BAKIM BİNASI

Acil Binası bodrum kat ve Tip 10 istinat duvarları betonarme imalatları, bodrum kat perdeleri su yalıtımı ve ısı yalıtımı imalatları tamamlanmıştır. Acil Binasının betonarme imalatları, perde betonu yalıtımı ve bodrum kat pis su ve yağmur suyu hattı imalatları devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %18 ve toplam nakdi gerçekleşme %16 olmuştur.

Gerçekleşme

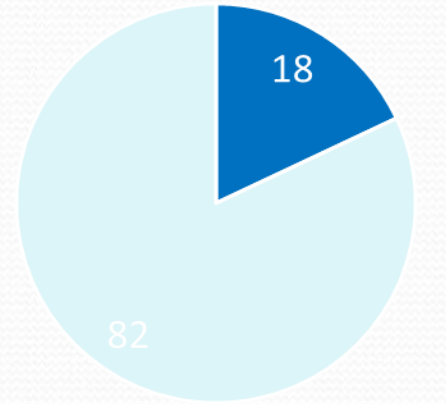

■ Tamamlanan ■ Kalan

ACİL VE YOĞUN BAKIM BİNASI



SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

OTOMATİK DÖNER KAPI YAPIMI

- Sözleşme tarihi : 13.09.2024
- İşin başlangıç tarihi : 16.09.2024
- İşin bitim tarihi : 14.11.2024
- Toplam sözleşme bedeli : 560.999,93-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 560.999,93-TL (KDV dahil)
- 2024 Yılı içinde ödenen tutar : 560.999,93-TL (KDV dahil)




SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

OTOMATİK DÖNER KAPI YAPIMI

İş tamamlanmış olup, geçici kabulü yapılmıştır. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur

Gerçekleşme

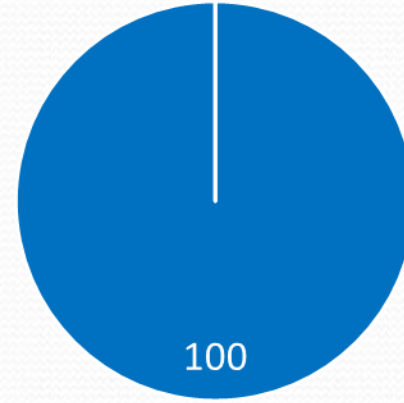

■ Tamamlanan ■ Kalan
