



T.C.

**TOKAT GAZİOSMANPAŞA
ÜNİVERSİTESİ**

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

2024 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Ocak-2025

HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının belirlenmiş amaçları, öngörülen hedefleri, mevcut fiziki durumu ve diğer bilgiler ile 2024 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda açıklanmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yatırımlarında ana kaynak özel bütçe olup yatırım ödenek miktarları bildirilen ihtiyaçlara göre değil bütçe imkânları elverdiği ölçüde T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. Ülke kaynakları dikkate alınarak verilen bu ödeneklerle başlanılmış olan ve devam eden yatırımların hizmete sunulması gecikebilmekte veya eksik kalabilmektedir. Bu durum Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nı yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Kaynakların kısıtlı oluşu dikkate alındığında; ihtiyaçların en başta doğru olarak tespiti, zamanında ortaya konulması ve önceliklendirilmesi önem kazanmaktadır. Yapılacak olan yatırımdan azami ölçüde istifade edilmesi her şeyden önce iyi planlanmasını gerektirmektedir. Bu ise proje aşaması için yeteri kadar zaman ayrılmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu itibarla çeşitli amaçlara yönelik yatırımların bütün olarak ele alınması ve bitirildiğinde hizmete açılacak şekilde planlanması gerekmektedir.

Saygılarımla arz ederim.

İlhan ÇELTEK
İMZA

SUNUŞ (HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU)	
İÇİNDEKİLER	
I- GENEL BİLGİLER	4
A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
B- İdareye İlişkin Bilgiler	4
1- Fiziksel Yapı	4
2- Teşkilat Yapısı	10
3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı	11
4- İnsan Kaynakları	12
II- AMAÇLAR VE HEDEFLER	14
A- Temel Politika ve Öncelikler	14
B- İdarenin Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler	14
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	14
A- Mali Bilgiler	14
1-Bütçe Uygulama Sonuçları	14
2-Diğer Hususlar Faaliyet ve Proje Bilgileri	16
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	34
A- Üstünlükler	34
B- Zayıflıklar	34
C- Değerlendirme	34
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER	35
EK	36
Harcama Yetkilisi İç Kontrol Güvence Beyanı	36

I-GENEL BİLGİLER

A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Daire başkanlığımız 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51-a maddesine istinaden Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Mali işlemler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, ihale işlemleri ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olarak yürütülmektedir.

Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 28.maddesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri;

a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,

b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santrali, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek.

olarak tanımlanmıştır.

Bu çerçevede birimimiz;

a) Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dershaneler, amfiler, konferans salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahaları, kamp yerleri gibi bina ve mekanların işlemleri de dahil fizibilite, proje, ihale, yapım sürelerindeki işlerin yürütülmesi,

b) Kampusun su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ve ısıtma gibi altyapı ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi,

c) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri, telefon santrali ve asansörler ile vrf sistemlerinin işletilmesini sağlamak, bakımı ve onarımlarını yapmak ya da yaptırılmasını sağlamak,

d) Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlanması gibi iş ve işlemleri yapmaktadır.

B- İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Tablo 1: Kapalı Alanlarının Dağılımı

Yerleşke Adı	Kapalı Alan Miktarı (m2)		Toplam (m2)
	Üniversite	Maliye Hazinesi/diğer	
Taşlıçiflik Yerleşkesi	200.026	0	200.026
Şehir Merkezi	85.953	0	85.953
İlçe Yerleşkeler	77.572	2.972	80.544
TOPLAM	363.551	2.972	366.523

Tablo 2: Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı				
Hizmet alanı	Taşlıçiftlik Yerleşkesi	Şehir Merkezi	İlçeler	Toplam(m2)
Eğitim	146.231	18.781	66.912	231.924
Sağlık		57.201	13.632	70.833
Beslenme	11.415			11.415
Kültür	17.566			17.566
spor	9.287			9.287
Diğer(idari,tesis,depo)	15.527	9.971		25.498
TOPLAM	200.026	85.953	80.544	366.523

Tablo 3: Taşınmazların Dağılımı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı				
Yerleşke Adı	Mülkiyet Duruma göre Taşınmaz alanı(m2)			Toplam (m2)
	Üniversite	Maliye Haz.	Diğer	
Taşlıçiftlik Yerleşkesi	1.112.970,44	385.141,63	0,00	1.498.112,07
Ali Şevki Erek yerleşkesi		80.588,65	0,00	80.588,65
Lojmanlar	1.959,84	0,00	0,00	1.959,84
Turhal Yerleşkesi	0,00	112.265,97	0,00	112.265,97
Zile Yerleşkesi	109.003,38	33.358,93	0,00	142.362,31
Erbaa Yerleşkesi	21.609,41	8.820,36	0,00	30.429,77
Niksar Yerleşkesi	1.681,63	301.024,77	0,00	302.706,40
Reşadiye MYO	3.257,85	4.319,15	0,00	7.577,00
Almus MYO	0,00	29.861,17	0,00	29.861,17
Artova MYO	0,00	0,00	14.352,04	14.352,04
Pazar MYO	0,00	0,00	5.504,40	5.504,40
Sulusaray	0,00	0,00	34.038,58	34.038,58
TOPLAM	1.250.482,55	955.380,63	53.895,02	2.259.758,20

Tablo 4: Mevcut Fiziki Kapalı Alanlar

BİRİMLER	MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m2)									
	İDARİ BİRİMLER	EĞİTİM ALANLARI		SOSYAL ALANLAR			ŞİRKÜLASYO N ALANI	SPOR ALANLARI		TOPLAM (m2)
		DERSLİK	LABORATUV AR	KANTİN KAFETERYA	LOJMAN	YURTLAR		Açık Spor Tesisleri	Kapalı Spor Tesisleri	
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	10.774	1.140	1.520	90	0	0	6.980	0	0	20.504
Ziraat Fakültesi	13.525	938	1.680	197	0	0	0	0	0	16.340
İç su balıkçılık tesisleri	0	0	263	0	0	0	0	0	0	263
Arıcılık Geliştirme	0	0	80	0	0	0	0	0	0	80
Fırın	0	0	190	0	0	0	0	0	0	190
Koyunculuk Geliştirme	0	0	864	0	0	0	0	0	0	864
Koyunculuk samanlık	0	0	225	0	0	0	0	0	0	225
Tavukçuluk Geliştirme (Kümes)	0	0	730	0	0	0	0	0	0	730
Doğal Boyalar,Ar-ge	0	0	604	0	0	0	0	0	0	604
Bahçe Bitkileri Uyg ön Haz.Lab.	0	0	110	0	0	0	0	0	0	110
Tarımsal Ar.veUyg.Me rk.Ek Bina	84	0	0	0	0	0	0	0	0	84
Eğitim Fakültesi	2.600	2.948	942	170	0	0	8.882	493	0	15.542
Eğitim Fakültesi Müzik Binası	130	1400	0	0	0	0	0	0	0	1.530
İslami İlimler Fakültesi	2552	4347	328	328	0	0	9093	0	0	16.648
Fen-Edebiyat Fakültesi	10.315	2.375	3.353	405	0	0	0	0	0	16.448
Devlet Konservatuva rı - Güzel San.Fak.	9.982	390	165	189	0	0	0	0	0	10.726
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	3.203	3.860	360	240	0	0	2.487	0	0	10.150
Spor Bilimleri Fakültesi	1.120	1.470	215	62	0	0	1.533	0	0	5.230
Tokat Meslek Yüksekokulu	3.203	3.860	360	240	0	0	2.487	0	0	10.150
Karmer-Tömer-Uzem-BAP-Eczacılık Fak.	250	80	1.350	0	0	0	1.000	0	0	4.200
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1.670	1.884	1298	128	0	0	6.731	0	0	11.711
Türkçe Öğretim Merkezi Binası		1.102	158	80						3.902

Şehit Ömer HalisdemirKongre ve Kültür Merk.	2.001	0	0	0	0	0	0	0	0	2.001
Hukuk Fak.- Adalet Y.O.- 15Temmuz Kongre ve Kültür Merk.	5.877	3.154	0	212			2.852			12.095
Merkezi Kütüphane	3.470	0	0	0	0	0	0	0	0	3.470
Kapalı Yüzme Havuzu	153	30	0	104	0	0	2.139	0	1.646	4.072
Kapalı Spor Salonu	0	0	0	0	0	0	0	0	3.275	3.275
Açık Spor Tesisleri	0	0	0	0	0	0	0	23.670,52	1.940	1.940
Merkezi Kafeterya	2952	0	0	2.098	0	0	0	0	0	5.050
Merkezi Yemekhane	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	4.500
Eğitim Fakültesi Öğrenci Kantini	0	0	0	485	0	0	0	0	0	485
Mutfak Binası	1.380	0	0	0	0	0	0	0	0	1.380
Rektörlük	4.950	0	0	0	0	0	0	0	0	4.950
Konukevi	1.350	0	0	295	0	0	405	0	0	2.390
Isı Merkezi	2.050	0	0	0	0	0	0	0	0	2.050
Ayniyat,Şoför Binası	514	0	0	0	0	0	0	0	0	514
Depo	1.000									1.000
Atölye	1.000									1.000
Ziraat Fak.Tarımsal Uygulama binası-1	1.000									1.000
Ziraat Fak.Tarımsal Uygulama binası-2	1.000									1.000
Isı Merkezi+ambulator+aynıyat	1.000									1.000
Çevre Düzenleme birimi+nizamiye	623									623
Sağlık Araş.Uyg.Merkezi yemekhane	0	0	0	970	0	0	0	0	0	970
Sağlık Araş.Uyg.Merkezi Poliklinik Binası+yoğun bakım+acil	22.146	0	0	0	0	0	0	0	0	22.146
600 Yataklı Hastane C Blok	32.000									32.000
Radyasyon Onkoloji Binası+Palyatif Bakım Merkezi	2.085									2.085

Tıp Fakültesi Morfoloji Binası	605,13	899,85	2.071,00	303,08	0	0	4.889,82	0	0	14.144
Dişhekimliği Fakültesi								0	0	2.100
Sağlık Kampüsü Derslik Binası	354,00	681,00	204,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0	0	2.537
Ali Şevki Ereğ Yerleşkesi Isı Merkezi	577	0	0	0	0	0	0	0	0	577
Sağlık Kampüsü Katlı kapalı otopark	4.475									4.475
Meydan lojmanları	0	0	0	0	1.093	0	626	0	0	1.719
Fıdanlık lojmanları	0	0	0	0	2.360	0	840	0	0	3.200
Zile Dinçerler Tur.veOtelcilik Yük.Ok.	2.351	620	0	606	0	2.400	1.656	510	0	7.607
Zile Meslek Yüksekokulu	1.116	1.200	135	385	0	0	1.314		0	4.150
Turhal Meslek Yüksekokulu	2.300	3.000		875	0	0	0	0	0	6.175
Turhal Sağlık Hizmetleri MYO										
Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi	842	2.130	216	190	0	0	2.682	0	0	6.060
Niksar Uygulamalı Bilimler Y.O.	2425	2039	200	140	0	0	2.757	2.010	0	7.561
Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi	3.461	3.084	222	1.395	0	0	5.578	0	0	13.740
Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi										
Erbaa Meslek Yüksekokulu										
Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO										
Reşadiye Meslek Yüksekokulu	2750	1541	200	703	0	0	2.158	0	0	7.352
Almus Meslek Yüksekokulu	1.034	1.528	470	430	0	0	1.038	510	0	4.500
Artova Meslek Yüksekokulu	423	1.016	135	94	0	0	1.304	510		2.972
Pazar Meslek Yüksekokulu	1.943	1.454	353	293	0	0	2.752			6.795
Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi				500						13.632
GENEL TOPLAM	170.615	48.171	19.001	16.207	3.453	2.400	73.481	27.703	6.861	366.523

1.1- Sosyal Alanlar

1.1.1- Lojmanlar

Birim Adı	Daire Sayısı (Adet)	Alan (m ²)	Boş Daire (Adet)
Fidanlık Lojmanları	20	3.200	0
Meydan lojmanları	9	1.719	2
Toplam	29	4.919	0

1.2- Hizmet Alanları


1.2.1- İdari Personel Hizmet Alanları

	Sayı(adet)	Alan(m2)	Kullanan Sayısı (kişi)
Servis			
Çalışma Odası	25	622	56
Toplam	25	622	56

1.3- Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları

	Ambar		Arşiv		Atölye	
	Sayı(adet)	Alan(m2)	Sayı(adet)	Alan(m2)	Sayı(adet)	Alan(m2)
Taşlıçiftlik Yerleşkesi					1	900
Ali Şevki Erek Şehir Yerleşkesi						
İlçe Yerleşkeleri						
Toplam					1	900

2- Teşkilat Yapısı

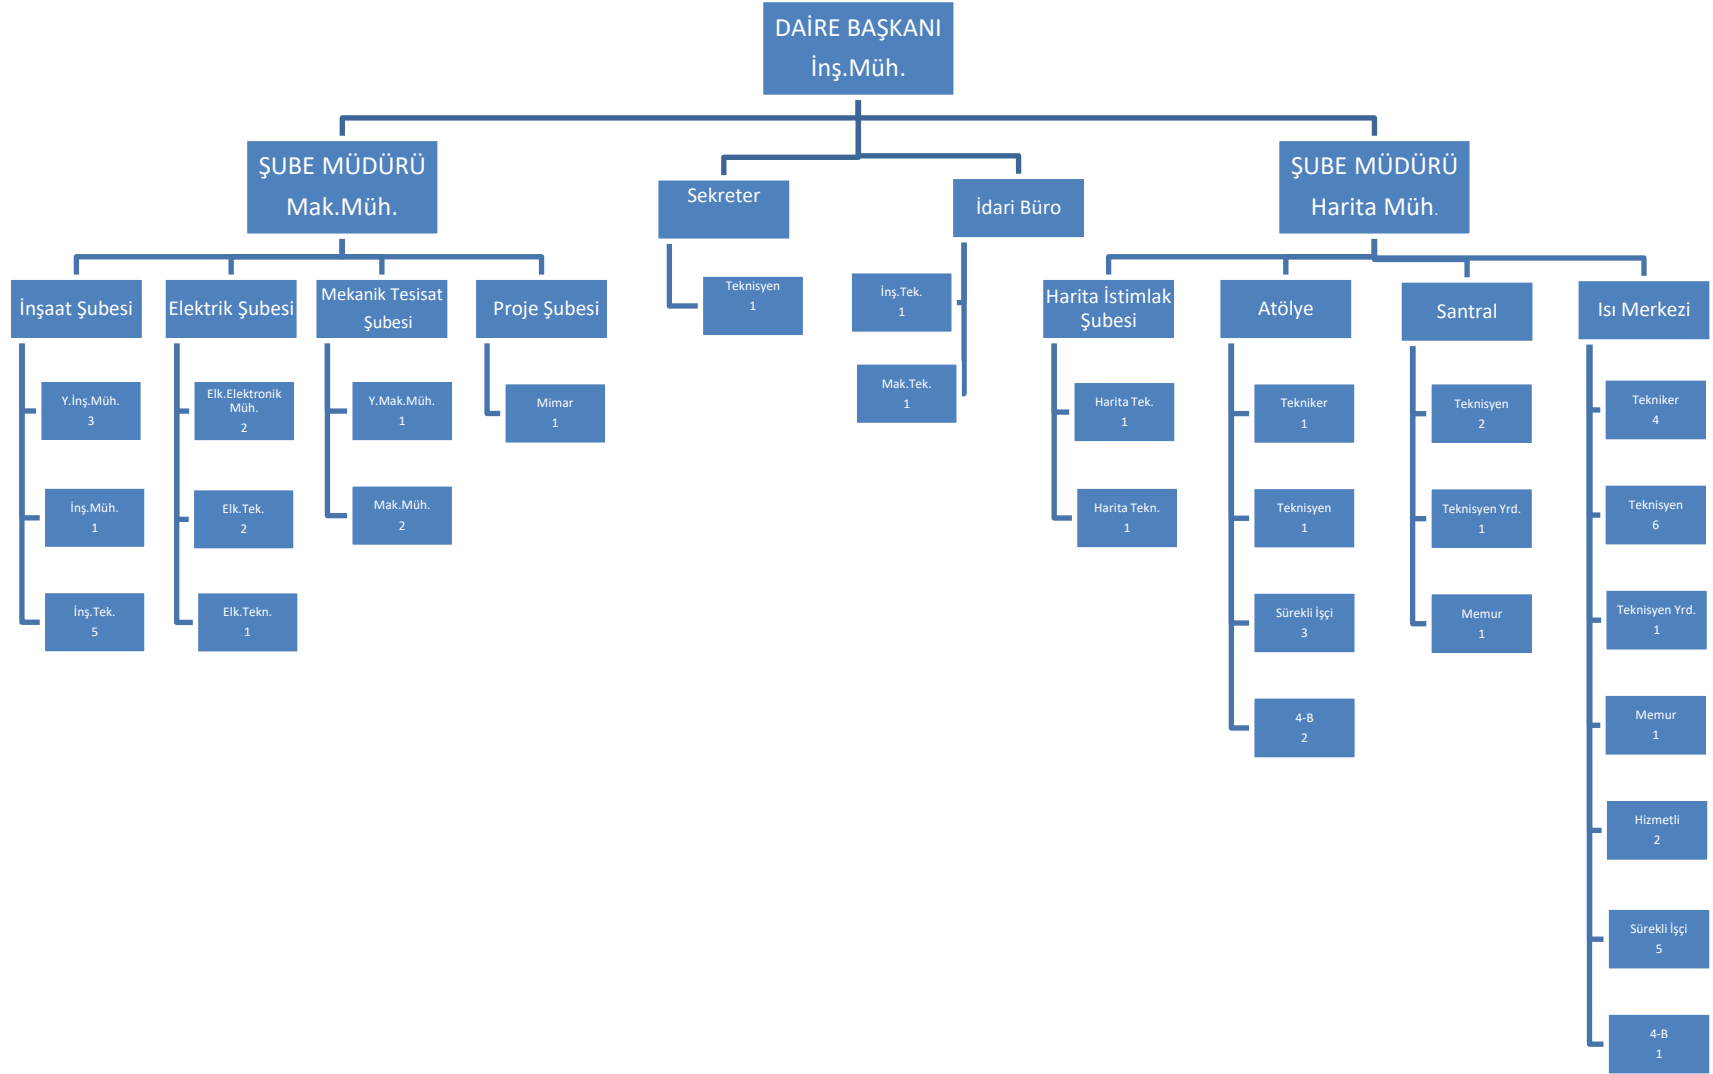

3- Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

3.1- Yazılımlar

Yazılım Adı	Kullanan Birim
Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Autocad	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Telefon Santrali ücret hesaplama programı	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

3.2- Bilgisayarlar

	İdari Amaçlı Sayı (adet)	Eğitim Amaçlı Sayı(adet)	Araştırma Amaçlı Sayı(adet)	Toplam
Masaüstü Bilgisayar	56			56
Netbook				
Taşınabilir Bilgisayar	2			2

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Cinsi	İdari Amaçlı (Adet)	Eğitim Amaçlı (Adet)	Araştırma Amaçlı (Adet)
Akıllı Masa			
Akıllı Tahta			
Barkod Okuyucu			
Barkod Yazıcısı			
Baskı Makinesi			
DVD'ler			
Episkop			
Faks			
Fotoğraf Makinesi			
Fotokopi Makinesi	1		
Görme Engelliler İçin Doküman Okuyucu			
Kameralar			
Mikroskoplar			
Müzik Setleri			
Optik Okuyucu			
Projeksiyon			
Slayt Makinası			
Tarayıcılar	1		
Televizyonlar			
Tepegöz			
Yazıcı	26		

4- İnsan Kaynakları

4.1- İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu					
	İlköğretim	Lise	Ön Lisans	Lisans	Yüksek Lisans ve Doktora
Kişi Sayısı	0	7	19	15	4
%	0%	16%	42%	33%	9%

4.2- İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi						
	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15 Yıl	16 -20 Yıl	21-Üzeri
Kişi Sayısı	1	1	4	4	6	29
%	2%	2%	9%	9%	14%	64%

4.3- İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı							
	21 Yaş Altı	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51 Yaş Üzeri
Kişi Sayısı	0	1	3	1	4	10	26
%	0%	2%	7%	2%	9%	22%	58%

4.4- Personelin Cinsiyet Dağılımı

	Kadın	Erkek	Toplam	K%	E%
Akademik Personel					
İdari Personel	3	42	45	7	93
Toplam	3	41	45	7	93

4.5- Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri

Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri						
Sözleşmeli Personel Hizmet Süreleri (657sK-4/B)						
	1-3 Yıl	4-6 Yıl	7-10 Yıl	11-15 Yıl	16 -20 Yıl	21-Üzeri
Kişi Sayısı	3					
%	100					
Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri (657sK-4/D)						
Kişi Sayısı					7	2
%					78	22

4.6- Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

Sözleşmeli Personel ve Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

Sözleşmeli Personel Yaş İtibariyle Dağılımı (657sK-4/B)

	21 Yaş Altı	21-25 Yaş	26-30 Yaş	31-35 Yaş	36-40 Yaş	41-50 Yaş	51 Yaş üzeri
Kişi Sayısı		3					
%		100					
Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı (657sK-4/D)							
Kişi Sayısı				1	1	7	
%				11	11	78	

II- AMAÇLAR VE HEDEFLER

A- Temel Politika ve Öncelikler

- 15.01.2024 tarih ve 32430 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2024 Yılı Yatırım Programı,
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı,
- 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2. maddesi gereğince karar verilen “2024 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” ve ilgili mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde yar alan projelerin yıl içi işlemleri ve izlenmesine dair usul ve esaslar

B- İdarenin Stratejik Planında Yer alan Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaç	Stratejik Hedef
Amaç (A5) Kurumsal kapasiteyi nicelik ve nitelik bakımından geliştirmek.	H5.3. Altyapı ve fiziksel alanlar güçlendirilecektir.

III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A- Mali Bilgiler

1-Bütçe Uygulama Sonuçları

1.1-Bütçe Giderleri

	2024 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEK LEKLEŞME ORANI
	TL	TL	%
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			
01 - PERSONEL GİDERLERİ	67.066.000	39.951.224	60
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.749.000	5.160.742	67
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.383.000	172.405	13
05 - CARİ TRANSFERLER			
06 - SERMAYE GİDERLERİ	330.200.000	347.321.564	105

1.2- Maliyet Fayda/Maliyet Etkinlik Analizi (2024)

		2024	Birim
	Personel Sayısı+Öğrenci Sayısı		Kişi
Elektrik	Kapalı Alan	200.026 ⁽¹⁾	m ²
	Elektrik Tüketim Miktarı	3.490.462 ⁽¹⁾	Kwh
	Elektrik Gideri	12.324.307 ⁽¹⁾	TL
	Personel+Öğrenci Başına Düşen Elektrik Gideri		TL
	Kapalı Alan Başına Düşen Elektrik Gideri	61,61 ⁽¹⁾	TL
Su	Kapalı Alan	194.403 ⁽²⁾	m ²
	Su Tüketim Miktarı	350.706 ⁽²⁾	m ³
	Su Gideri		TL
	Personel+Öğrenci Başına Düşen Su Gideri		TL
	Kapalı Alan Başına Düşen Su Gideri		TL
Doğalgaz	Kapalı Alan	185.585 ⁽³⁾	m ²
	Doğalgaz Tüketim Miktarı	1.788.725 ⁽³⁾	m ³
	Doğalgaz Gideri	25.666.155 ⁽³⁾	TL
	Personel+Öğrenci Başına Düşen Doğalgaz Gideri		TL
	Kapalı Alan Başına Düşen Doğalgaz Gideri	135,60	TL
Yurtiçi Görevlendirme (Yolluk)	Yurtiçi Görevlendirilen Personel Sayısı		Kişi
	Yurtiçi Yolluk Gideri		TL
	Personel Başına Düşen Yolluk Tutarı		TL
Yurtdışı Görevlendirme (Yolluk)	Yurtdışı Görevlendirilen Personel Sayısı		Kişi
	Yurtdışı Yolluk Gideri		TL
	Personel Başına Düşen Yolluk Tutarı		TL
Telefon ve İnternet Gideri	Telefon ve İnternet Gideri		TL
	Personel Başına Düşen Gider		TL
Personel Ulaşım Gideri	Personel Ulaşım Gideri		TL
	Personel Başına Düşen Gider		TL

(1)Taşlıçiftlik Kampüsü değerleridir. (Taşlıçiftlik Tütün Depoları “Çevre Birimi, Atölye, Depo, Ziraat Fakültesi Tarım Uygulamaları, Isı Merkezi + Ambar Ayniyat” dahil).

(2) Taşlıçiftlik Kampüsü değerleridir. (Taşlıçiftlik Tütün Depoları “Çevre Birimi, Atölye, Depo, Ziraat Fakültesi Tarım Uygulamaları, Isı Merkezi + Ambar Ayniyat” dahil değildir.)

(3) Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi değerleridir. (Çevre Birimi, Atölye, Depo, Ziraat Fakültesi Tarım Uygulamaları, Isı Merkezi + Ambar Ayniyat Merkezi Kafeterya Mutfak bölümü, Sosyal Tesis kafeterya Mutfak bölümü, Yüzme Havuzu Isıtma, Teniskortu ısıtma ve Konukevi ısıtma ile müstecirlere ait doğalgaz tüketim giderleri dahil değildir.)

2- Diğer Hususlar

1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

1.1.1- Yatırım Projeleri

1.1.1.1- Sektörler İtibarıyla Yatırım Uygulama Durumu

Sektör	Proje Sayısı	Proje Bedeli (TL)	Program Yılı Ödeneği (TL)	Eklenen (TL)	Düşülen (TL)	Toplam Serbest Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Nakti Gerçekleşme Yüzdesi (%)
Eğitim-Yüksek Öğretim	4	699.309.034	302.510.000	59.887.000	69.820.000	292.577.000	237.110.120	79
Sağlık	2	201.000.000	26.000.000	50.000.000		76.000.000	75.847.614	292

(1) Eğitim-Yükseköğretim sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında sadece Büyük Onarım işleri değerlendirilmiştir. Yayın alımı projesi gösterilmemiştir. Yıl içinde; Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında devam eden işlerden Rektörlük Binası'ndan 20.000.000-TL, Tıp Fakültesi Binası'ndan 15.000.000-TL olmak üzere toplam 35.000.000-TL Hukuk Fakültesi Binasına aktarılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında devam eden Hukuk Fakültesi Binası'ndan tasarruf tedbirleri kapsamında 34.8202.400-TL kesinti yapılmıştır. Yıl içinde; Muhtelif İşler projesi kapsamında yer alan Büyük Onarıma 4.875.000-TL, Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ise 12.000-TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

(2) Sağlık sektörü Muhtelif İşler projesi kapsamında sadece Hastane Büyük Onarım işleri değerlendirilmiştir. Acil ve Yoğun Bakım Binasına yıl içinde 75.000.000-TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

1.1.1.2- Yatırım Projelerinin Gerçekleşme Durumu

Proje No	2024H03-233538
Sektörü	Eğitim Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Etüt-Proje
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2024-2024

Proje Bedeli	2024 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
200.000	200.000	12.000	212.000	211.200	106	211.200


Açıklama: Yıl içinde 12.000-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Yıl içinde 211.200-TL harcama yapılmış olup; bu iş kapsamında Revizyon İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hazırlanması işi yaptırılmıştır.

Proje No	2020H03-151002
Sektörü	Eğitim Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	Kampüs Altyapısı - Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2020-2025


Proje Bedeli	2024 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
70.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	32.687.785	163	57.687.785

Açıklama: 2024 yılı başlangıç ödeneği 20.000.000,00-TL olup; yıl içinde 20.000.000-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 32.687.785-TL harcama yapılmıştır. Bu iş kapsamında;


- 1- Sulusaray Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Jeneratör Yapım işi için 2024 yılı içinde 7.843.778-TL harcanmış olup; köşk yeri kazısı, topraklama, beton imalatları, pano imalatları, köşk ve pano yerleşimi işleri, jeneratör imalatı ve yerleşimi tamamlanmış olup işin geçici kabulü yapılmıştır. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

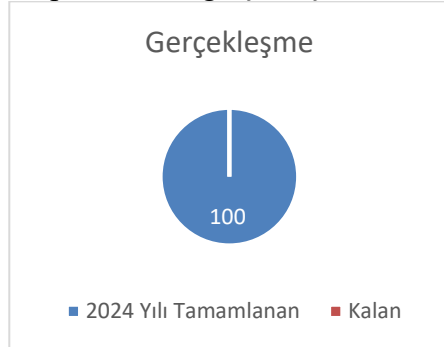


- 2- TÖMER Binası Altyapı ve Çevre Düzenleme Yapımı işi için 2024 yılı içinde 5.914.164-TL harcanmış olup; Çevre aydınlatma direk yerleri, kablolama ve kazı işleri, ön beton saha imalatları, arka beton saha imalatları, toprak dolgu imalatları, çevre imalatları ve kamelya imalatları tamamlanmış olup; geçici kabulü yapılmıştır. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

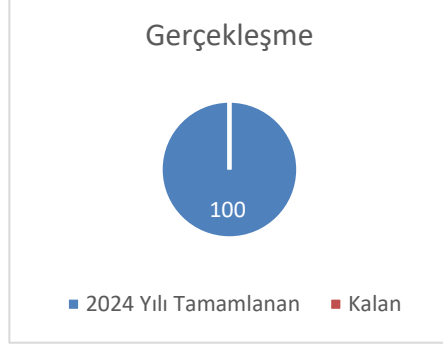

- 3- Meyve Kurutma Tesisi Altyapı Yapımı işi için 2024 yılı içinde 713.531-TL harcanmış olup; Meyve Kurutma Tesisi için gerekli altyapı işleri yaptırılmıştır. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

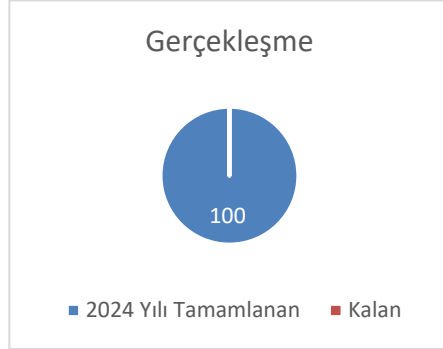


- 4- Rektörlük Binası Altyapı ve Çevre Düzenleme işi için 2024 yılı içinde 15.113.050-TL harcanmış olup; kapalı otopark imalatları, kutu menfez imalatları, bina arka kısım istinat perde duvar imalatları, havuz perdeleri ve havuz elektrik kablolama imalatları tamamlanmıştır. Havuz imalatları, perde imalatları, bordür imalatları ve çevre aydınlatma elektrik imalatları devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme % 77 ve toplam nakdi gerçekleşme % 76 olmuştur.

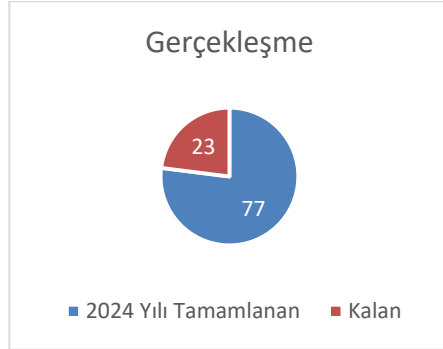



- 5- Garaj Yapımı işi için 2024 yılı içinde 1.511.354-TL harcanmış olup; Kazı imalatları, temel beton imalatları ve topraklama imalatları tamamlanmıştır. İnşaat ve elektrik tesisat imalatları devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme % 49 ve toplam nakdi gerçekleşme % 48 olmuştur.

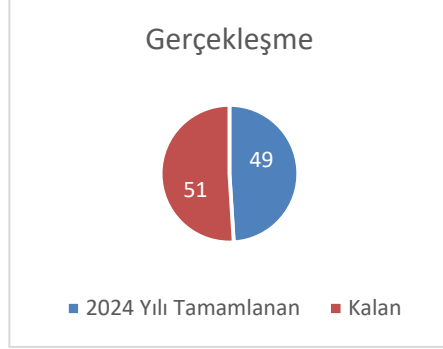

- 6- 2024 Yılı içinde toplamda 1.591.908-TL harcama yapılarak; Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Binası çevre düzenleme işleri, Su Deposu İnverter Değişimi, Su Kuyusu Pano Revizyon İş, Taşlıçiftlik Kampüsü Bina Otomasyon Tadilat İş, 4 nolu Su Kuyusu Pompa Değişimi, 2 nolu Su Kuyusu Kolon Hattı Değişimi, Isı Merkezi Kızgın Su Kazanı Tadilat ve Onarımı, Nem Alma Santrali Altyapı Bakım ve Onarımı, Isı Merkezi 3 Nolu Kızgın Su Kazanı Tadilatı işleri yaptırılmıştır.

Proje No	2022H03-186981
Sektörü	Eğitim Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2022-2026


Proje Bedeli	2024 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
617.799.034	271.004.000	-34.820.400	236.179.600	225.392.927	83	388.187.961

Açıklama: 2024 yılı başlangıç ödeneği 271.004.000-TL olup; yıl içinde tasarruf tedbirleri kapsamında 34.820.400-TL ödenek kesintisi yapılmıştır. 2024 yılı içinde 225.392.927-TL harcama yapılmıştır. Bu proje ana proje olup; TÖMER Binası, Rektörlük Binası, Tıp Fakültesi Binası ve Hukuk Fakültesi Binası olmak üzere dört adet alt projeden oluşmaktadır.

Proje No	2022H03-186981-187509
Sektörü	Eğitim Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	TÖMER Binası – 4.000 m ²
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2022-2024

Proje Bedeli	2024 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
41.969.034	10.004.000		10.004.000	7.919.113	79	39.637.819

Açıklama: 2024 yılı başlangıç ödeneği 10.004.000-TL olup; 4.000-TL'si Döner Sermaye bütçesindendir. 2024 yılı içinde 7.919.113-TL harcanmış olup; bu iş kapsamında; dış duvar yalıtım ve tuğla kaplama imalatları, şap imalatları, fayans imalatları ile diğer inşaat imalatları ve mekanik ve elektrik tesisat imalatları tamamlanarak işin geçici kabulü yapılmıştır. 2024 yılı fiziki gerçekleşme %11 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

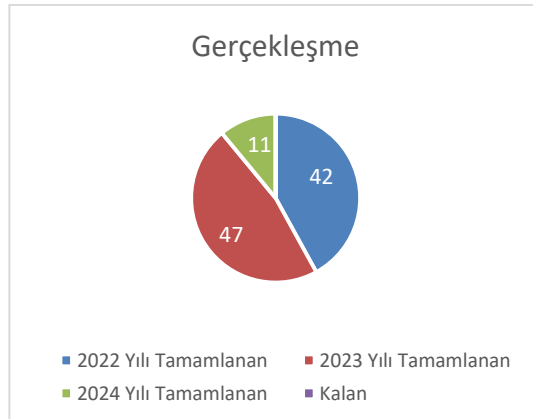




Proje No	2022H03-186981-187671
Sektörü	Eğitim Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	Rektörlük Binası 10.385 m ²
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2022-2024

Proje Bedeli	2024 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
151.718.000	75.000.000	-20.000.000	55.000.000	49.248.399	66	125.966.428

Açıklama: 2024 yılı başlangıç ödeneği 75.000.000-TL olup; yıl içinde 20.000.000-TL Hukuk Fakültesi Binası İnşaatına aktarılmıştır. 2024 yılı içinde 49.248.399-TL harcanmış olup; bu iş kapsamında; dış cephe imalatları, boya imalatları, kapı ve pencere imalatları ve diğer inşaat imalatları ile mekanik ve elektrik tesisat imalatları tamamlanarak işin geçici kabulü yapılmıştır. 2024 Yılı fiziki gerçekleşme %20 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

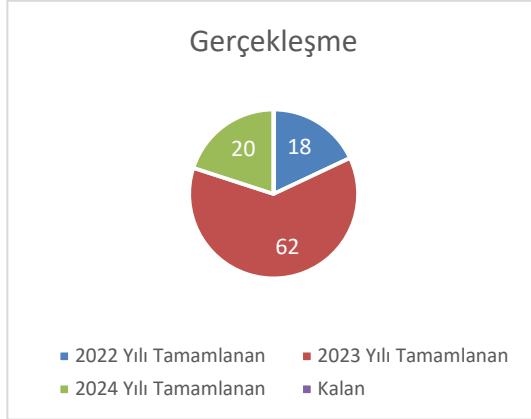






Proje No	2022H03-186981-187671
Sektörü	Eğitim Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	Tıp Fakültesi Binası 8.000 m ²
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2022-2024

Proje Bedeli	2024 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
124.112.000	70.000.000	-15.000.000	55.000.000	52.047.165	74	107.675.287

Açıklama: 2024 yılı başlangıç ödeneği 70.000.000-TL olup; yıl içinde 15.000.000-TL Hukuk Fakültesi Binası İnşaatına aktarılmıştır. 2024 yılı içinde 52.047.165-TL harcanmış olup; bu iş kapsamında; dış cephe imalatları, boya imalatları, kapı ve pencere imalatları ve diğer inşaat imalatları ile mekanik ve elektrik tesisat imalatları tamamlanmıştır. İşin geçici kabulü eksiklikleri tamamlanmaktadır. 2024 Yılı fiziki gerçekleşme %30 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

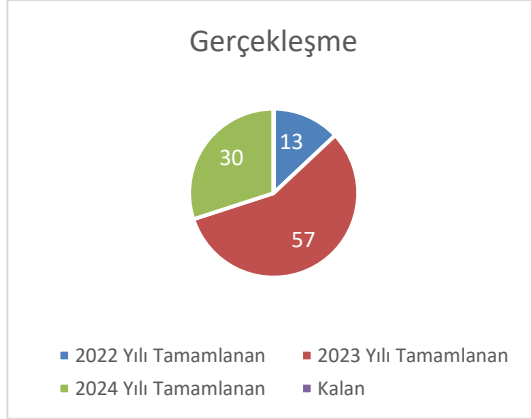


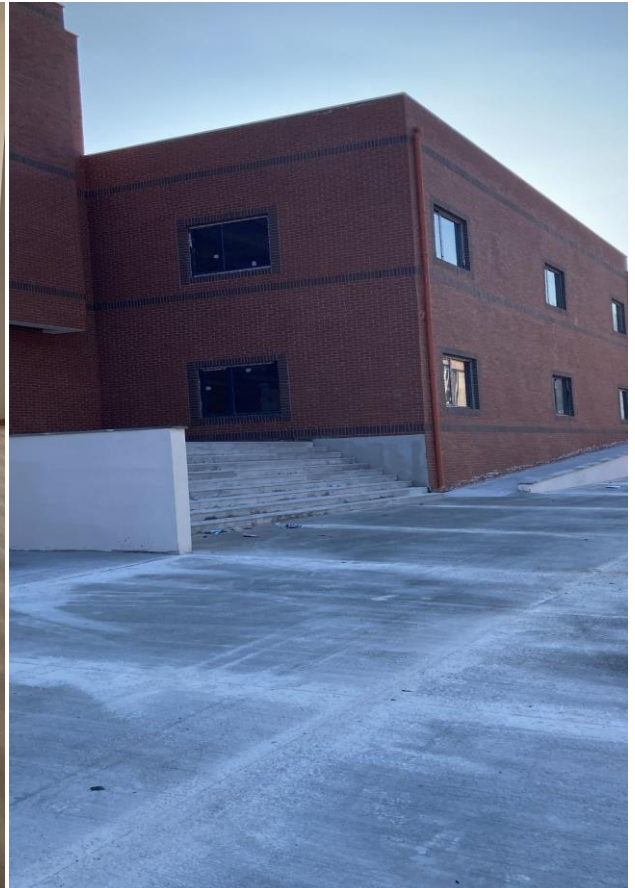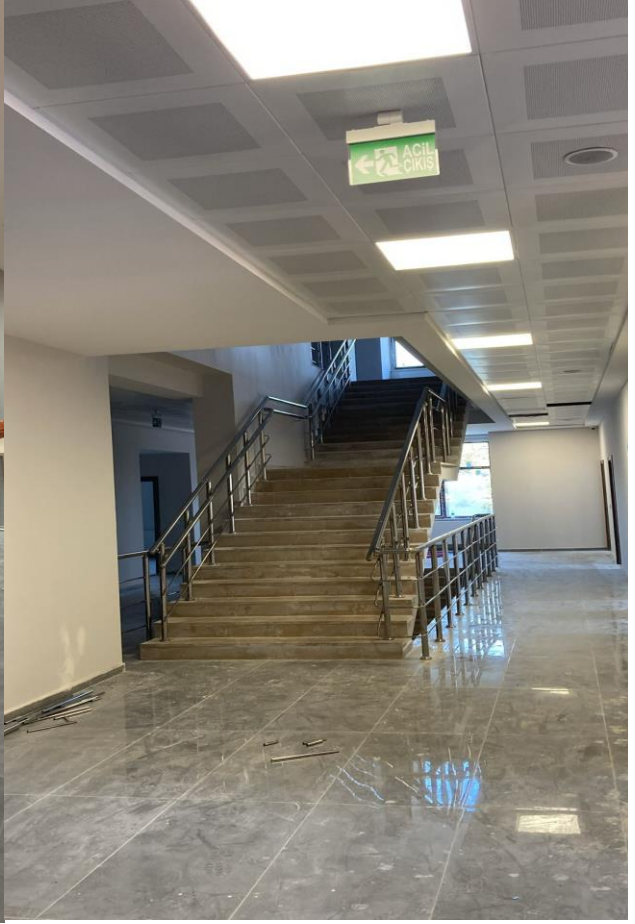

Proje No	2022H03-186981-213012
Sektörü	Eğitim Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	Hukuk Fakültesi Binası 10.000 m ²
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2023-2026

Proje Bedeli	2024 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
300.000.000	116.000.000	179.600	116.179.600	116.178.251	100	116.178.251

Açıklama: 2024 yılı başlangıç ödeneği 116.000.000,00-TL olup; yıl içinde tasarruf tedbirleri kapsamında 34.820.400-TL ödenek kesintisi yapılmıştır. Yıl içinde Rektörlük Binası projesinden 20.000.000-TL ve Tıp Fakültesi projesinden 15.000.000-TL olmak üzere toplam 35.000.000-TL ödenek aktarması yapılmıştır. 2024 yılı içinde 52.047.165-TL harcanmış olup; bu iş kapsamında, B blok betonarme imalatları, temel, kazı dolgu imalatları tamamlanmıştır. A blok betonarme imalatları ve B blok duvar imalatları, alçı sıva asma tavan imalatları, mekanik tesisat işleri ve elektrik tesisat işleri devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %68 ve toplam nakdi gerçekleşme %66 olmuştur.

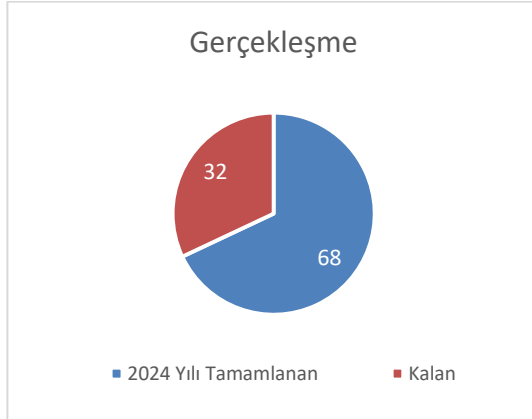

Proje No	2024H03-233540
Sektörü	Eğitim Yükseköğretim
Proje Adı ve Özellikleri	Muhtelif İşler Büyük Onarım
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2024-2024

Proje Bedeli	2024 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
11.310.000	11.310.000	4.875.000	16.185.000	11.717.193	104	11.717.193

Açıklama: 2024 yılı başlangıç ödeneği 11.310.000-TL olup; yıl içinde 4.875.000-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2024 yılı içinde 11.717.193-TL harcanmış olup, bu proje kapsamında;

- 1- Eski Mutfak Binası Tadilat ve Onarım işi 2024 yılı içinde 3.875.258-TL harcama yapılmış olup bu iş kapsamında; eski mutfak binasının tadilat ve onarım işleri yaptırılmıştır.



- 2- Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2024 Yılı Büyük Onarım İnşaatı işi 2024 yılı içinde 2.145.463-TL harcama yapılmış olup bu iş kapsamında; Artova MYO güvenlik filesi yapımı, Erbaa MYO lama ve profil demirden çeşitli demir işleri, alçı levhalar ile asma tavan imalatı ve bölme duvar imalatları, Erbaa MYO kütüphane elektrik montaj işleri tamamlanmış olup; işin geçici kabulü yapılmıştır. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.





- 3- Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Solar Kurutma Ünitesi Yapımı işi 2024 yılı içinde 1.822.398-TL harcama yapılmış olup iş tamamlanmış geçici kabul eksiklikleri giderilmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.
- 4- 2024 Yılı içinde toplamda 3.874.074-TL harcama yapılarak; Üniversitemizin çeşitli birimlerinin bakım ve onarım işleri yaptırılmıştır.

Proje No	2023I00-192530
Sektörü	Sağlık
Proje Adı ve Özellikleri	Acil ve Yoğun Bakım Binası Etüt-Proje, Hastane İnşaatı (5.000 m ²)
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2023-2026

Proje Bedeli	2024 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklene Ödenek	Toplam Ödenek			
200.000.000	25.000.000	50.000.000	75.000.000	74.874.486	300	75.332.888

Açıklama: 2024 yılı başlangıç ödeneği 25.000.000-TL olup; yıl içinde 50.000.000-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2024 yılı içinde 74.874.486-TL harcanmış olup, bu proje kapsamında; Acil Binası bodrum kat ve Tip 10 istinat duvarları betonarme imalatları, bodrum kat perdeleri su yalıtımı ve ısı yalıtımı imalatları, Acil Binasının betonarme imalatları, perde betonu yalıtımı ve bodrum kat pis su ve yağmur suyu hattı imalatları tamamlanmıştır. İnşaat işleri, mekanik ve elektrik tesisat imalatları devam etmektedir. 2024 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %40 ve toplam nakdi gerçekleşme %39 olmuştur.

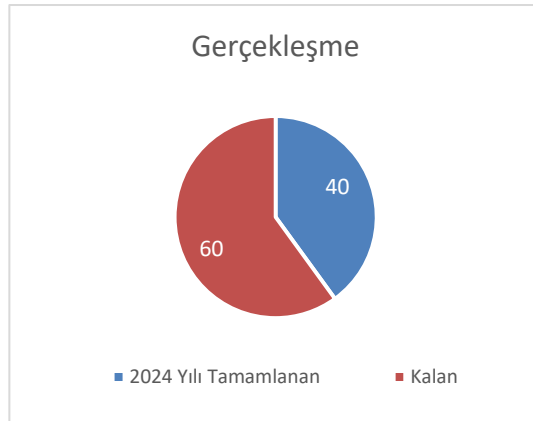

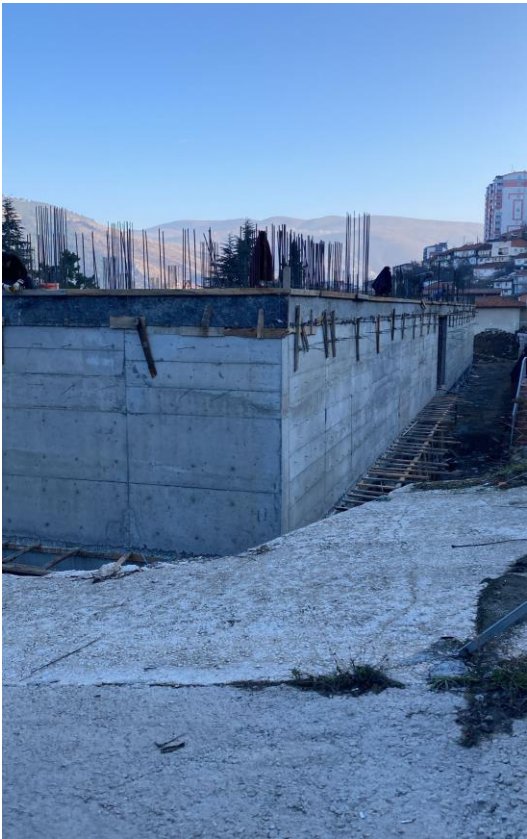

Proje No	2023I00-229550
Sektörü	Sağlık
Proje Adı ve Özellikleri	Muhtelif İşler Büyük Onarım
Proje Yeri	Tokat
Proje Başlama ve Bitiş Tarihi	2024-2024

Proje Bedeli	2024 Yılı Ödeneği	Revize Ödenek		Harcama	Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı (%)	Kümülatif Harcama
		Eklenen Ödenek	Toplam Ödenek			
1.000.000 ⁽¹⁾	1.000.000			973.128	97	973.128

(1) Bu proje kapsamında Büyük Onarım ödeneği ve bilgileri değerlendirilmiştir.

Açıklama: 2024 yılı başlangıç ödeneği 1.000.000,00-TL olup; yıl içinde 973.128-TL harcanmıştır. Bu proje kapsamında;

- 1- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Otomatik Döner Kapı Yapımı işinde 561.000-TL harcama yapılarak Araştırma ve Uygulama Hastanesi girişine otomatik döner kapı yaptırılmıştır.



- 2- Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kompanzasyon Bakım ve Onarım ile hastanede muhtelif bakım ve onarım işleri yaptırılarak 412.128-TL harcama yapılmıştır.

KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-Üstünlükler

- 1- Karar alma ve uygulamanın Üniversitemizde olmasının ihtiyaç ve problemlerin yerinde görülmesine ve çözümüne vermiş olduğu avantaj,
- 2- Karar alma ve uygulamanın Üniversitemizde olması nedeni ile yatırımların planlama veya uygulama safhalarında meydana gelebilecek aksaklık veya hatadan geriye dönüş kolaylığı,
- 3- Yapılan hizmetlerin hedefe ulaşmasındaki yüksek etkinlik,
- 4- Teknik personelin kalite açısından yeterliliği ve çalışmalarında yüksek teknolojiye olan ilgisi ve bunları kullanabilmesi.
- 5- Karar alma ve uygulamanın Üniversitemizde olması nedeni ile yatırımların planlama veya uygulama safhalarında meydana gelebilecek aksaklık veya hatadan geriye dönüş kolaylığı,

B- Zayıflıklar

- 1- Yatırımların planlanması ve uygulanmasında, Master Planın olmayışından ileri gelen uzun vadeli programların yapılamayışı ve alternatiflerinin geliştirilememesi,
- 2- Yetişmiş teknik elemanların diğer birimlere gitme eğilimi,
- 3- Yatırım Programı dışında iş talebinde bulunulması,
- 4- Yatırım Programı paralelinde büyümekte olan Üniversitemize ait kapalı alan (m²) miktarlarına kifayet edebilecek şekilde ve yeterli miktarda olmayan büyük onarım ve küçük onarım ödeneklerindeki artışlarla yaşanan yetersizlikler ile mevcut ödeneklerin ihtiyaç öncelikli olarak kullanılmasında yaşanan olumsuzlukların neden olduğu onarım ve tadilatlarda zamanında müdahalede geç kalınma ihtimal durumlarının yaşanması.
- 5- Üniversitemiz hizmet binaları ve altyapı küçük bakım ve onarım işlerinde anında müdahale edebilecek yeterli kalifiyeli teknik elemana, teçhizata ve ödenğe sahip olmayışı,
- 6- Periyodik bakım gerektiren cihazların ve makinaların arızalarının giderilmesi için Tokat ili ve ilçelerinde işin uzmanı yeterli teknik eleman ve yedek parçanın olmayışı,
- 7- Isı merkezi ve kampus binalarının tamamında ısıtma sisteminde otomasyona geçilememesi,
- 8- Ziraat Fakültesinin kullandığı tarım arazilerinde ve kampusteki yeşil alanlarının sulanmasında içme suyu deposunun kullanılmasına devam edilmekte oluşu ve depo harici sulama sistemine geçilememiş olması,

C- Değerlendirme

Arzu edilen sonuçlara ulaşılabilme için Başkanlığımız bünyesinde yeteri kadar teknik personel mevcuttur. Bu personellerin kendi branşlarında eğitilerek uzmanlaştırılması suretiyle nitelikli hale getirilmesine ve gerekli teknolojik imkanlarla desteklenerek teknik kapasitelerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Faaliyet gösterilen konularda yayımlanmış mevzuatın gerektiği gibi bilinmesi, yine faaliyet konularında ilgili teknolojik ve bilimsel verilere vakıf

olma ve teknolojik yeniliklerden haberdar olma konusunda eksiklerin olduğu görülmektedir. Bir diğer tespit edilen husus ise teknik elemanlarımızın kendine güven ve cesaret konusunda motivasyon eksikliğidir. Bu hususun yetkili kişilere hesap verme zorunluluğu, yanlış yapma ya da beğendirememe korkusu sonucu risk almama isteğinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir.

Bu bağlamda her branşta görev yapan personel için ihtiyacı olan lisanslı bilgisayar yazılım ve donanım eksiklerinin giderilmesi, yine ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin sağlanması, teknik görgülerinin artırılması için ülke bazında değişik zamanlarda düzenlenen teknik fuarlara katılmalarının sağlanması ve bazı branşlarda yetkili kamu kuruluşlarının tertiplediği eğitim faaliyetlerine iştirak etmelerinin sağlanması düşünülmektedir.

Ayrıca görsel tecrübenin geliştirilmesi en ciddi sorun olarak gözlemlenmiş olup bu amaçla yurt içinde gezi programları düzenlenerek son teknolojik imkanların kullanıldığı yerlerin gözle görülüp incelenmesinin oldukça yararlı olacağı da düşünülmektedir.

V-ÖNERİ VE TEDBİRLER

Yapılacak olan her işin bir kaynak tüketimini gerektirdiği dikkate alınarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olan yatırımlardan azami ölçüde istifade edebilmek için planlama ve proje aşamasına yeterli zaman ayrılması gerektiği göz önüne alınmalıdır. Bu sebeple Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından yapılacak yatırım taleplerinin ihtiyaçtan mümkün olabildiğince önce yapılmasına özen gösterilmelidir.

Üniversitemiz Yatırım Programı kapsamında devam eden inşaatların yılı ödeneklerinin temini söz konusu inşaatlarda gecikilmeden ve süresi dahilinde tamamlanabilmeleri açısından zaruret teşkil etmektedir. Üniversitemizin büyüyen yapı stoğundaki onarım ve tadilat ihtiyaçlarının zamanında karşılanabilmesi için yeterli oranda yılı ödenek tahsisi gereklidir.

YENİ

EK 1: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [1]

Harcama yetkilisi olarak görev ve yetkilerim çerçevesinde;

Harcama birimimizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerin idarenin amaç ve hedeflerine, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, birimimize bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların planlanmış amaçlar doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, birimimizde iç kontrol sisteminin yeterli ve makul güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, yönetim bilgi sistemleri, iç kontrol sistemi değerlendirme raporları, izleme ve değerlendirme raporları ile denetim raporlarına dayanmaktadır. [2]

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. [3]

(Tokat-13/01/2025)

İmza
İlhan ÇELTEK
Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanı

[1] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [2] Yıl içerisinde harcama yetkilisi değişmişse “benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler” ibaresi de eklenir. [3] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.

