2026 Yılı Devam Eden Projeler

Eğitim Yükseköğretim Sektörü


MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LABORATUVAR BİNASI ETÜT PROJE İŞİ

- Sözleşme tarihi : 20.04.2026
- İşin başlangıç tarihi : 24.04.2026
- İşin bitim tarihi : 20.09.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 1.416.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 1.416.000,00-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 1.416.000,00-TL (KDV dahil)



MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ LABORATUVAR BİNASI ETÜT PROJE İŞİ

İş tamamlanmış ve kabulü yapılmıştır. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

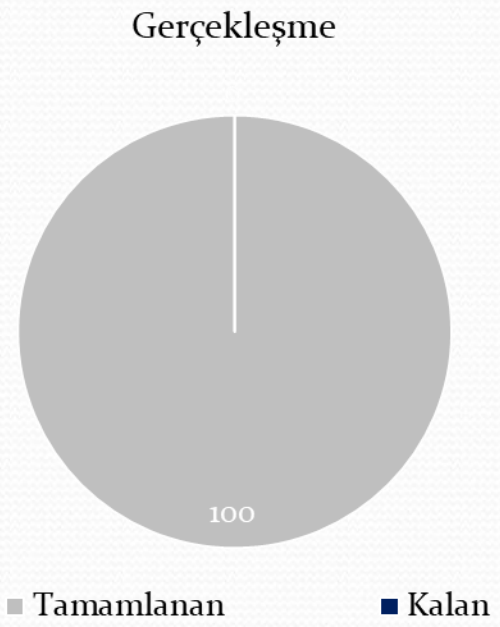


ZİLE MYO ISI MERKEZİ İLE ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO ISI MERKEZİ REVİZYON İŞLERİ

- Sözleşme tarihi : 04.03.2026
- İşin başlangıç tarihi : 09.03.2026
- İşin bitim tarihi : 05.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 3.036.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 3.036.000,00-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 3.036.000,00-TL (KDV dahil)



ZİLE MYO ISI MERKEZİ İLE ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO ISI MERKEZİ REVİZYON İŞLERİ

Zile MYO Isı Merkezi ve Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YO mevcut eski kalorifer kazanları ile ekipmanlarının demontajı, hurda mutfak ekipmanlarının demontajı, yeni kaskad sistem yoğuşmalı duvar tipi kalorifer kazanlarının ve ekipmanları ile ısıtma tesisat işleri, sıhhi tesisat işleri, elektrik tesisat işleri, doğalgaz tesisat işleri ve baca imalatları tamamlanmıştır. İş tamamlanmış, geçici kabulü yapılmıştır. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme % 100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

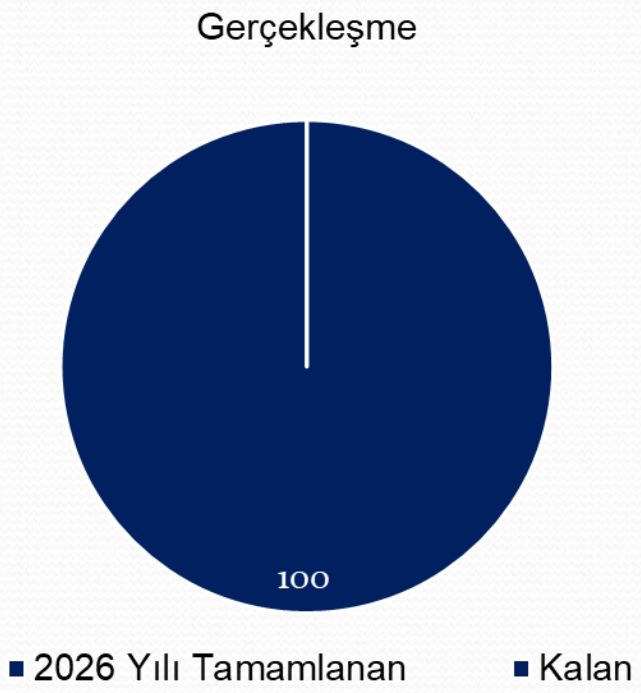

ZİLE MYO ISI MERKEZİ İLE ZİLE DİNÇERLER TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YO ISI MERKEZİ REVİZYON İŞLERİ










SAĞLIK KAMPÜSÜ 1000 TONLUK SU DEPOSU

- Sözleşme tarihi : 17.09.2025
- İşin başlangıç tarihi : 22.09.2025
- İşin bitim tarihi : 17.06.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 21.610.643,35-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 21.610.643,35-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 11.607.321,00-TL (KDV dahil)




SAĞLIK KAMPÜSÜ 1000 TONLUK SU DEPOSU

İş tamamlanmış olup; geçici kabul aşamasındadır. 2026 yılı fiziki gerçekleşme %46 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

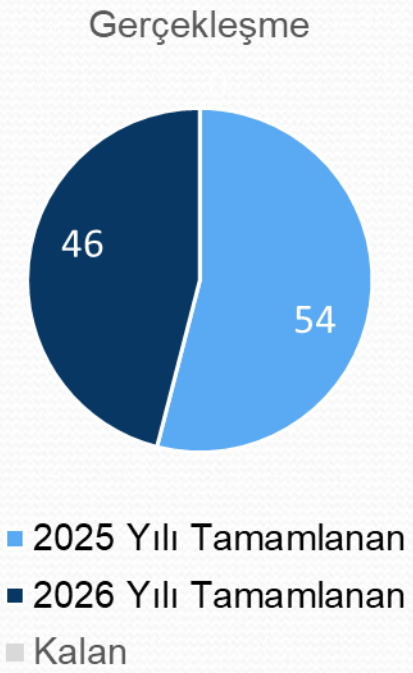


SAĞLIK KAMPÜSÜ 1000 TONLUK SU DEPOSU

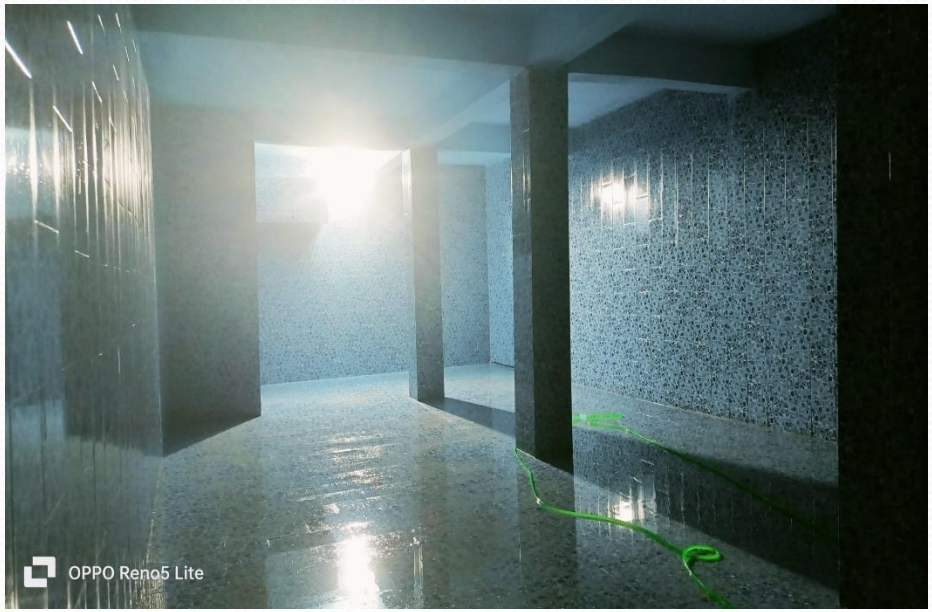





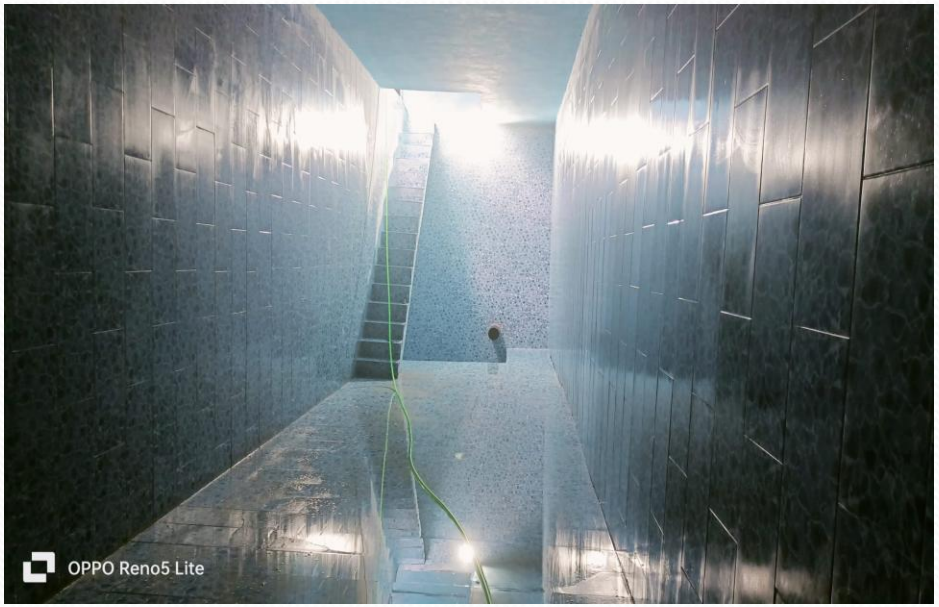


KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI

- Sözleşme tarihi : 01.12.2025
- İşin başlangıç tarihi : 04.12.2025
- İşin bitim tarihi : 09.09.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 18.632.636,07-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 18.632.636,07-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 15.369.858,90-TL (KDV dahil)



KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI

İslami İlimler Fakültesi kazı imalatları, İslami İlimler Fakültesi beton imalatları, İslami İlimler Fakültesi önü açık spor tesisleri beton imalatları, Mühendislik yolu perde duvar ve yaya yolu tadilat işleri, İslami İlimler Fakültesi yaya yolu Yeni Rektörlük Binası çevre perde duvar sıva imalatlar, basketbol sahası, Hukuk Fakültesi çevre düzenleme işleri, kamelya işleri, İslami İlimler Fakültesi yaya yolu işleri yapılmış olup iş tamamlanmıştır. 2026 yılı fiziki gerçekleşme %77 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

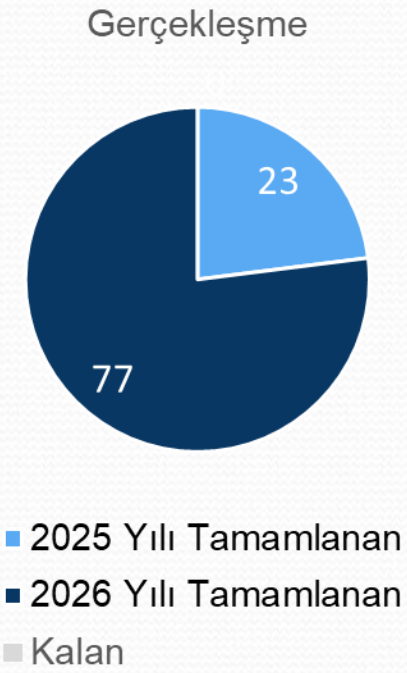


ERBAA MYO VE REŞADİYE MYO ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

- Sözleşme tarihi : 07.05.2026
- İşin başlangıç tarihi : 12.05.2026
- İşin bitim tarihi : 08.09.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 12.401.906,67-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 12.401.906,67-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 12.401.906,67-TL (KDV dahil)



ERBAA MYO VE REŞADİYE MYO ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ


Erbaa basketbol sahası taban beton imalatları, Reşadiye taş duvar imalatları, Reşadiye çevre imalatları tamamlanmış ve işin geçici kabulü yapılmıştır. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

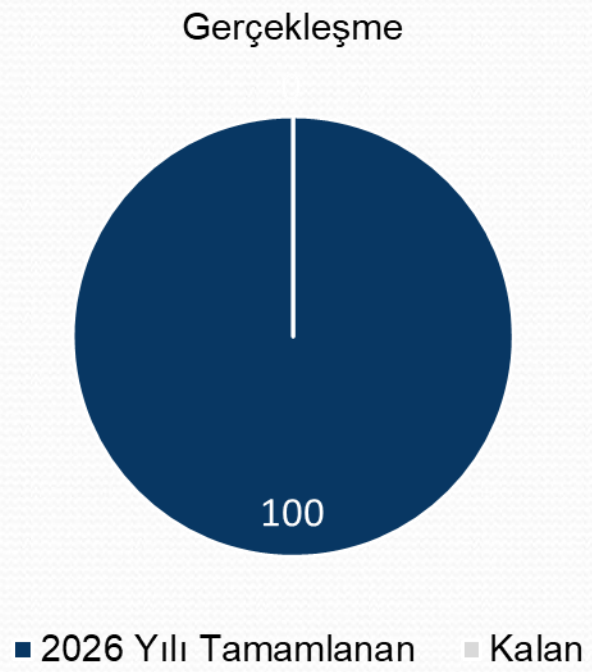

TAŞLIÇİFTLİK KAMPÜSÜ MEKANİK TESİSAT REVİZYON İŞLERİ

- Sözleşme tarihi : 05.08.2026
- İşin başlangıç tarihi : 06.08.2026
- İşin bitim tarihi : 04.10.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 2.467.113,01-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 2.467.113,01-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 2.467.113,01-TL (KDV dahil)

İş tamamlanmış olup; geçici kabulü yapılmıştır. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

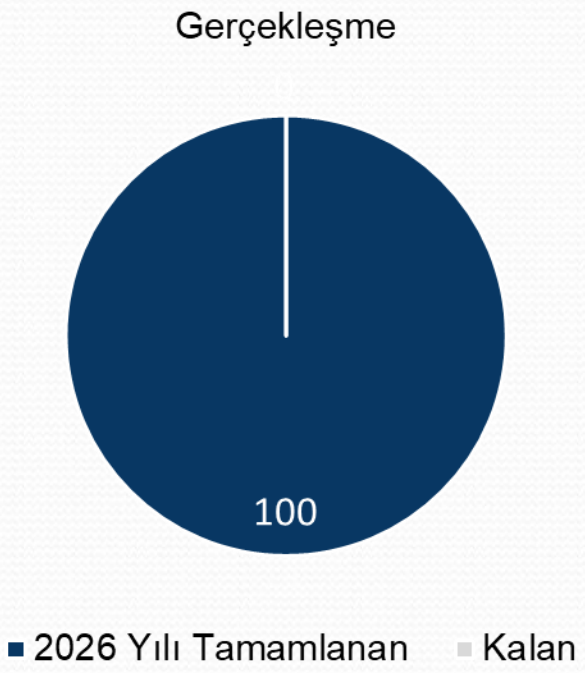

TURHAL KAMPÜSÜ OG REVİZYON İŞİ


- Sözleşme tarihi : 19.08.2026
- İşin başlangıç tarihi : 24.08.2026
- İşin bitim tarihi : 01.12.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 8.788.800,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 4.952.828,38-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 4.952.828,38-TL (KDV dahil)





TURHAL KAMPÜSÜ OG REVİZYON İŞİ


OG hattı kablolama ve trafo kurulum işleri, çevre aydınlatma işleri tamamlanmıştır. Den Edebiyat Fakültesi revizyon işleri devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %60 ve toplam nakdi gerçekleşme %56 olmuştur.

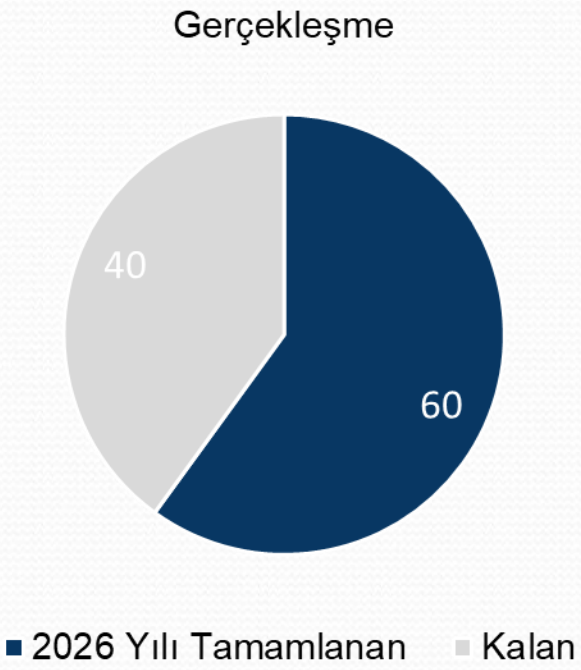

SAĞLIK KAMPÜSÜ TAK YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ


- Sözleşme tarihi : 16.10.2026
- İşin başlangıç tarihi : 20.10.2026
- İşin bitim tarihi : 18.03.2027
- Toplam sözleşme bedeli : 13.906.800,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 0,00-TL (KDV dahil)



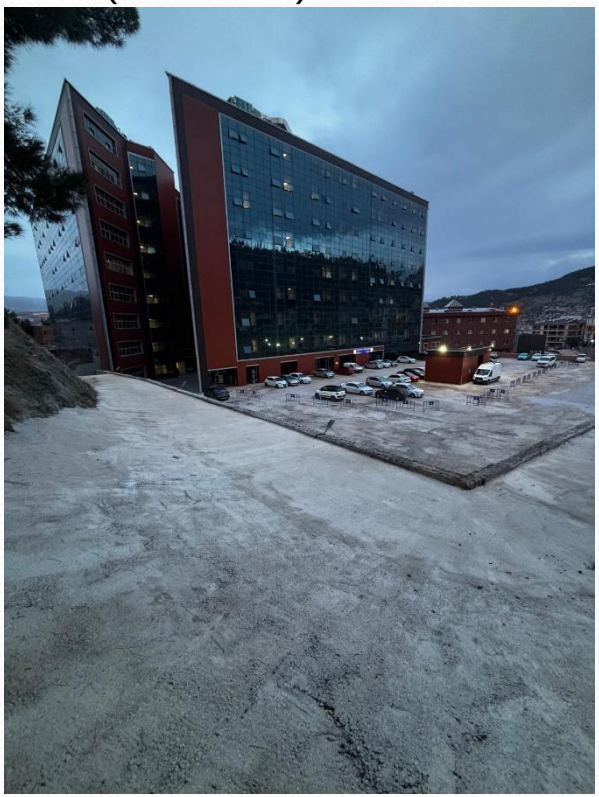


SAĞLIK KAMPÜSÜ TAK YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

Hastane C blok çevre düzenleme işleri devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %10 ve toplam nakdi gerçekleşme %0 olmuştur.

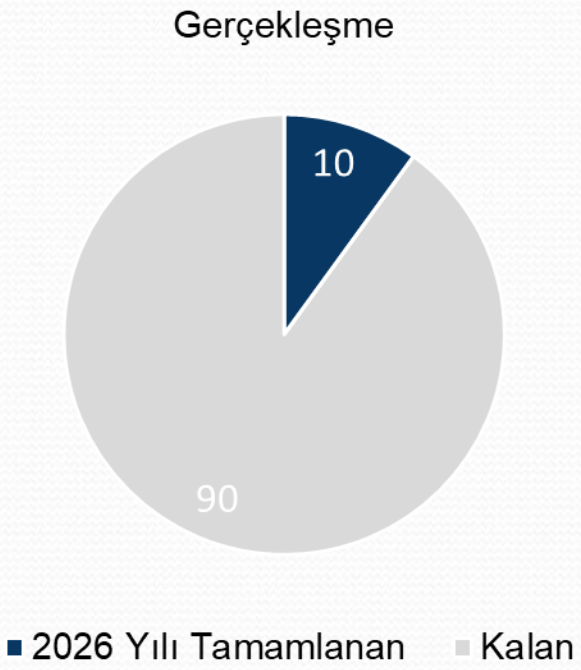


MERKEZİ KÜTÜPHANE BİNASI İNŞAATI

- Kapalı Alan : 11.384 m^2
- Sözleşme tarihi : 18.06.2026
- İşin başlangıç tarihi : 22.06.2026
- İşin bitim tarihi : 10.07.2028
- Toplam sözleşme bedeli : 453.384.722,76-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 9.197.732,99-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 9.197.732,99-TL (KDV dahil)

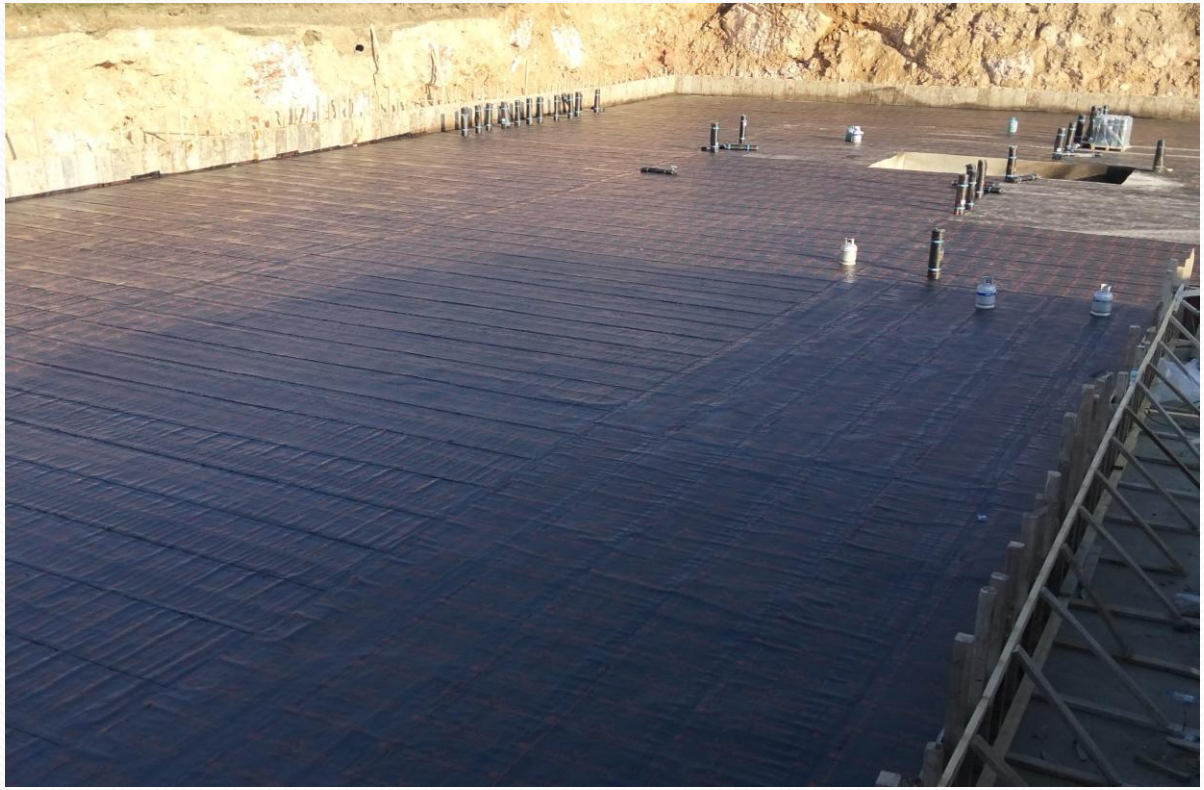

MERKEZİ KÜTÜPHANE BİNASI İNŞAATI

Temel kazı imalatları tamamlanmış, temel yalıtım kalıp, demir ve beton imalatları devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %4 ve toplam nakdi gerçekleşme %2 olmuştur.

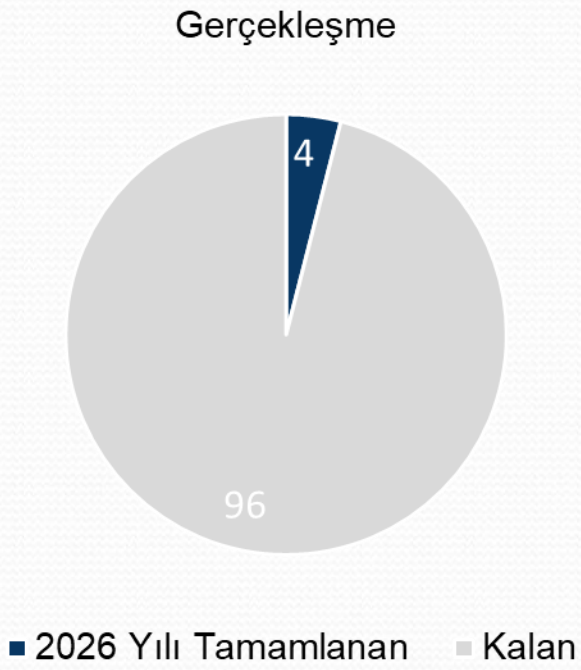

MERKEZİ KÜTÜPHANE BİNASI İNŞAATI










FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ASANSÖR YAPIM İŞİ

- Sözleşme tarihi : 09.04.2026
- İşin başlangıç tarihi : 13.04.2026
- İşin bitim tarihi : 10.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 3.465.961,05-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 3.465.961,05-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 3.465.961,05-TL (KDV dahil)

Asansör imalatı tamamlanarak işin geçici kabulü yapılmıştır. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

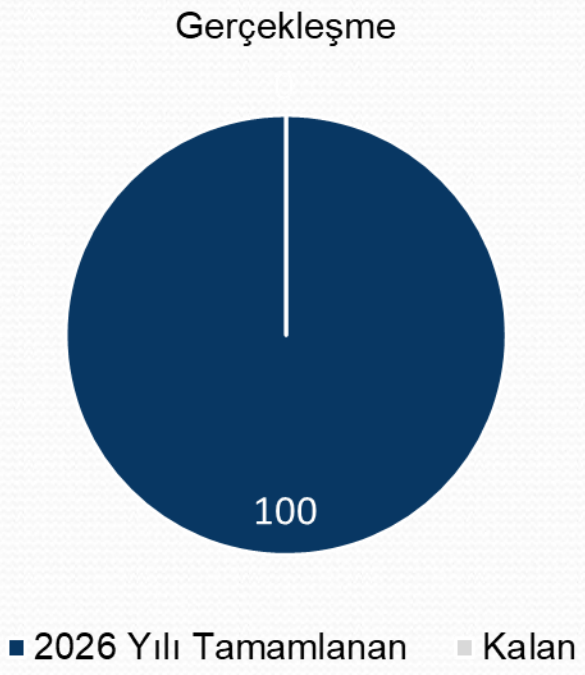


PLANETARYUM YAPIM İŞİ

- Sözleşme tarihi : 21.05.2026
- İşin başlangıç tarihi : 04.06.2026
- İşin bitim tarihi : 16.11.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 11.398.152,97-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 9.446.238,13-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 9.446.238,13-TL (KDV dahil)



PLANETARYUM YAPIM İŞİ

Temel imalatları ve çelik konstrüksiyon imalatları tamamlanmıştır. Dış cephe kaplama imalatları, alçıpan duvar imalatları ve elektrik tesisat imalatları devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %88 ve toplam nakdi gerçekleşme %83 olmuştur.

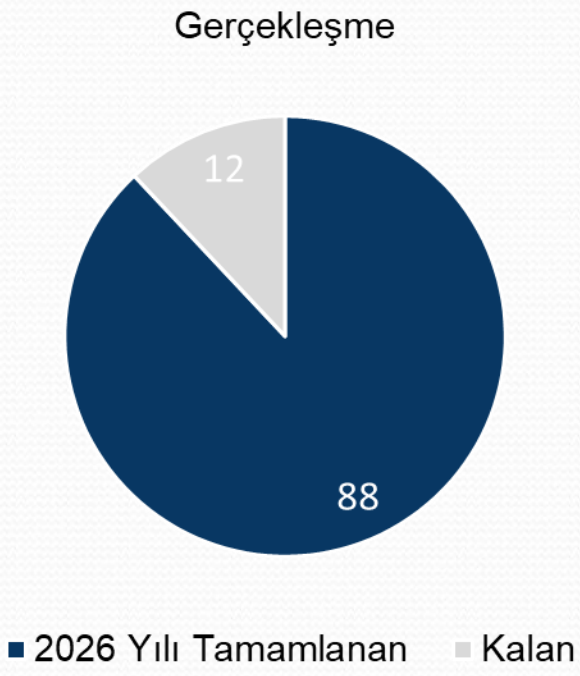

PLANETARYUM YAPIM İŞİ









MERKEZİ KAFETERYA BULAŞIKHANE ONARIM İŞİ


- Sözleşme tarihi : 04.06.2026
- İşin başlangıç tarihi : 05.06.2026
- İşin bitim tarihi : 02.09.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 6.412.705,82-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 6.412.705,82-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 6.412.705,82-TL (KDV dahil)







MERKEZİ KAFETERYA BULAŞIKHANE ONARIM İŞİ

İş tamamlanmış ve geçici kabulü yapılmıştır. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

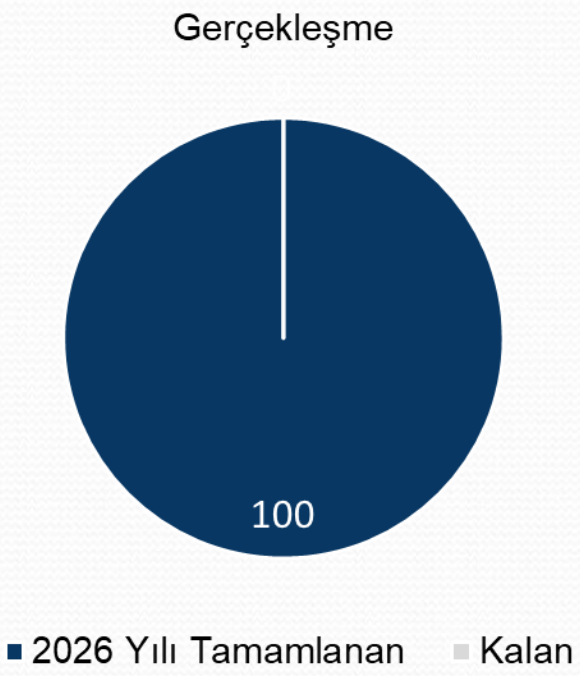

MERKEZİ KAFETERYA BULAŞIKHANE ONARIM İŞİ

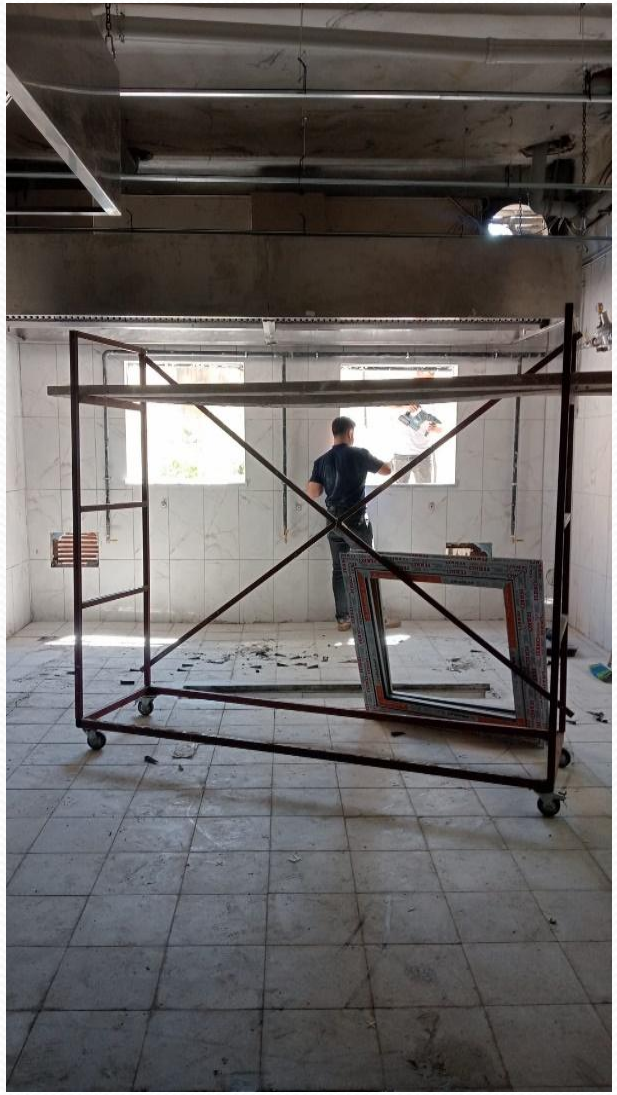

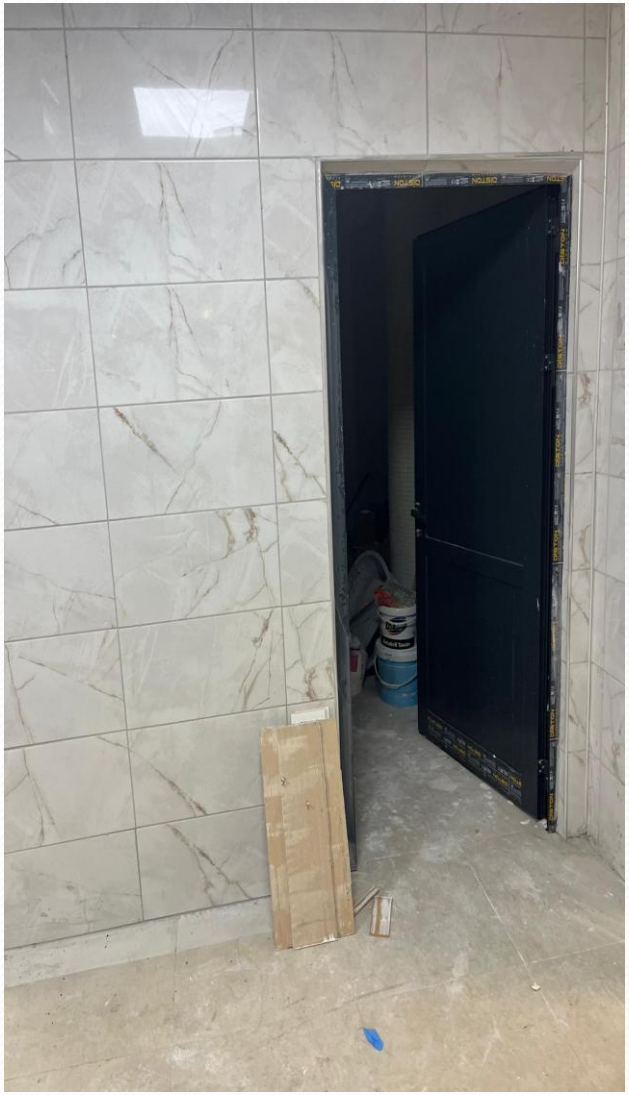




MERKEZİ LABORATUVAR ÇATI YAPIMI İŞİ

- Sözleşme tarihi : 10.06.2026
- İşin başlangıç tarihi : 17.06.2026
- İşin bitim tarihi : 14.10.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 4.354.340,81-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 4.354.340,81-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 4.354.340,81-TL (KDV dahil)



MERKEZİ LABORATUVAR ÇATI YAPIMI İŞİ

İş tamamlanmış olup; geçici kabulü yapılmıştır. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

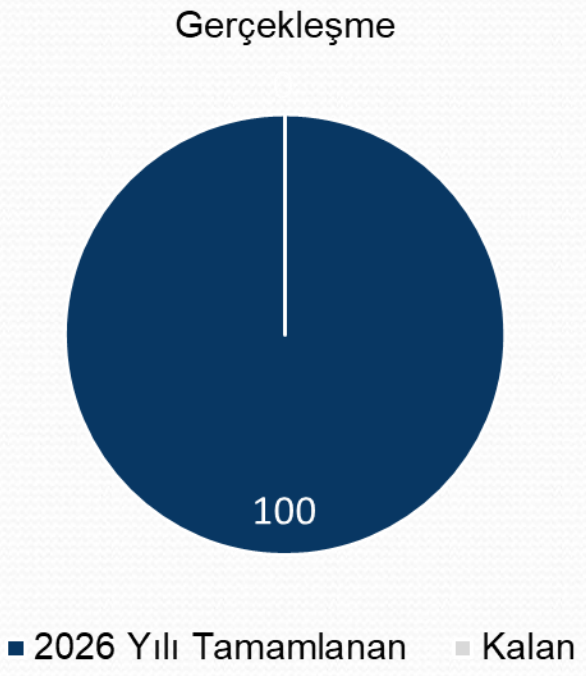


TIP FAKÜLTESİ BECERİ LABORATUVARI YAPIMI İŞİ

- Sözleşme tarihi : 08.07.2026
- İşin başlangıç tarihi : 08.07.2026
- İşin bitim tarihi : 20.09.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 4.922.666,03-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 4.922.666,03-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 4.922.666,03-TL (KDV dahil)



TIP FAKÜLTESİ BECERİ LABORATUVARI YAPIMI İŞİ

İş tamamlanmış olup; geçici kabulü yapılmıştır. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ile toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

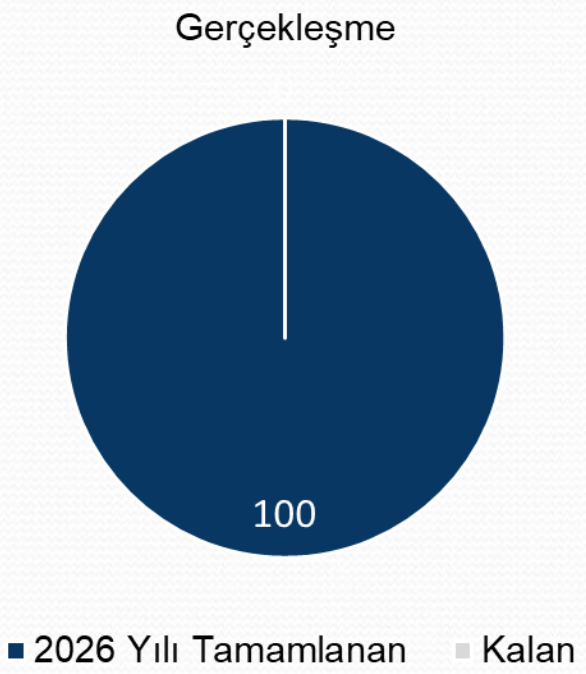

2026 Yılı Devam Eden Projeler

Sağlık Sektörü


ACİL VE YOĞUN BAKIM BİNASI

- Kapalı Alan : 5.480 m^2
- Sözleşme tarihi : 31.05.2024
- İşin başlangıç tarihi : 03.06.2024
- İşin bitim tarihi : 11.08.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 244.346.363,99-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 244.346.363,99-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 40.094.719,39-TL (KDV dahil)



ACİL VE YOĞUN BAKIM BİNASI

İnşaat tamamlanmış olup; geçici kabul aşamasındadır. 2026 yılı fiziki gerçekleşme %9 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

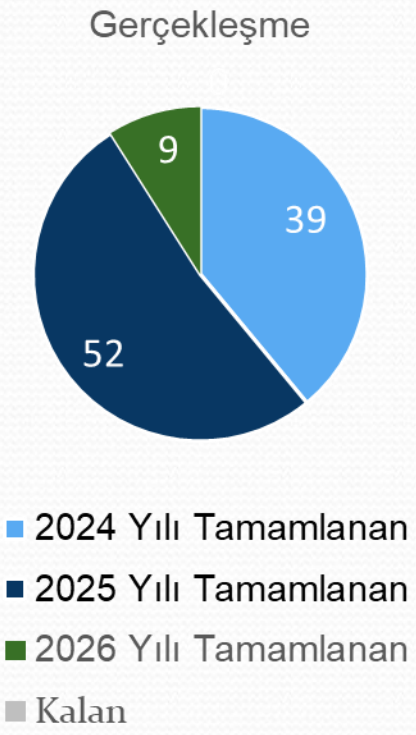

ACİL VE YOĞUN BAKIM BİNASI











HASTANE EK BİNA (KATLI OTOPARK)


- Kapalı Alan : 6.250 m^2
- Sözleşme tarihi : 29.09.2025
- İşin başlangıç tarihi : 06.10.2025
- İşin bitim tarihi : 14.12.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 100.320.187,78-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 92.348.268,66-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 60.736.652,73-TL (KDV dahil)

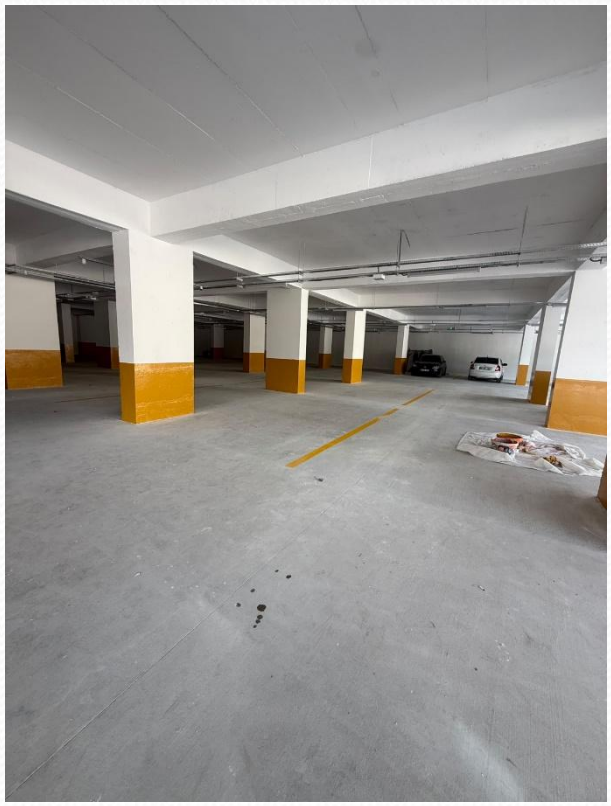

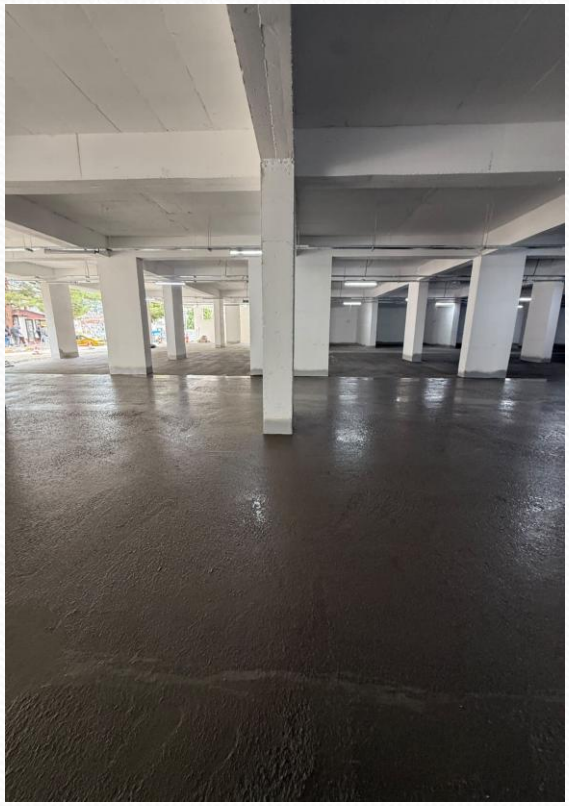

HASTANE EK BİNA (KATLI OTOPARK)

Betonarme imalatları tamamlanmıştır. Çevre imalatları, mekanik ve elektrik tesisat işleri devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleşme %55 artarak toplam fiziki gerçekleşme %91 ve toplam nakdi gerçekleşme %93 olmuştur.

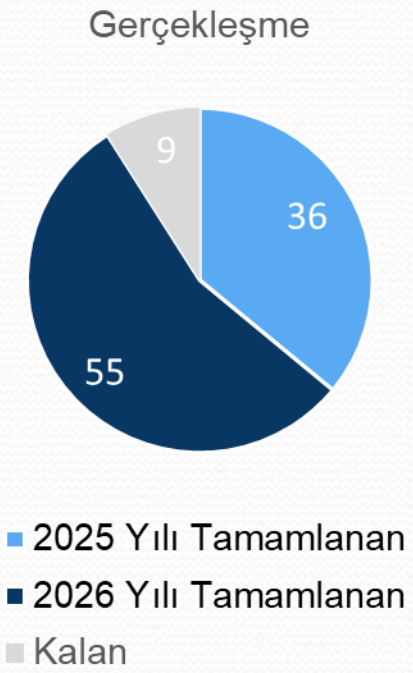


HASTANE EK BİNA (KATLI OTOPARK)







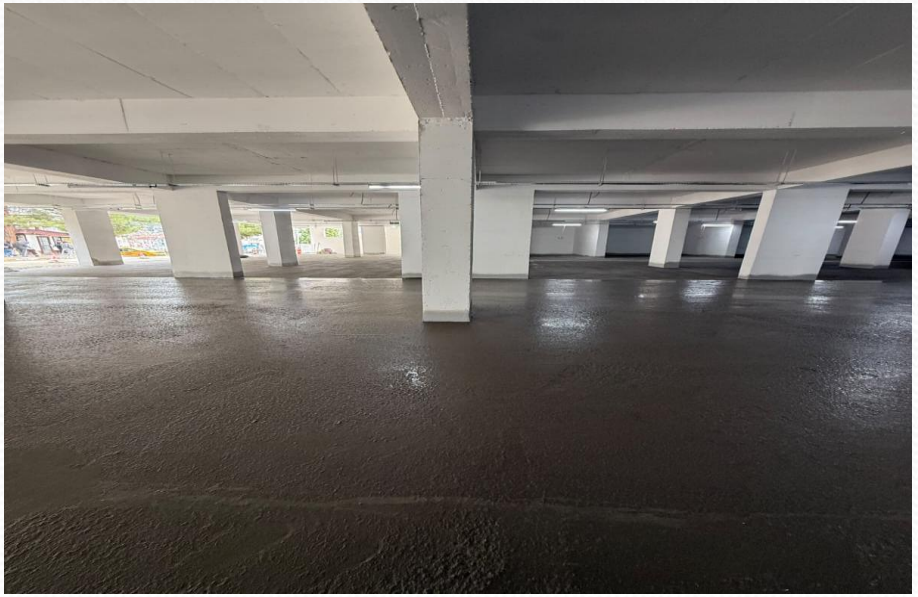


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ BİNASI

- Kapalı Alan : 12.730 m^2
- Sözleşme tarihi : 10.11.2025
- İşin başlangıç tarihi : 14.11.2025
- İşin bitim tarihi : 12.03.2028
- Toplam sözleşme bedeli : 590.265.188,20-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 240.672.334,16-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 225.242.749,25-TL (KDV dahil)



DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ BİNASI

A Blok kaba inşaat imalatları, B, D Blok 2.kat kaba inşaat imalatları, D Blok 3.kat kolon ve perde imalatları, bodrum ve zemin kat tuğla duvar imalatları tamamlanmıştır. D blok 3.kat betonarme imalatları, 1.kat tuğla duvar imalatları, bodrum kat sıva imalatları ve havalandırma tesisatı imalatları devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleşme %35 artarak toplam fiziki gerçekleşme %39 ve toplam nakdi gerçekleşme %37 olmuştur.

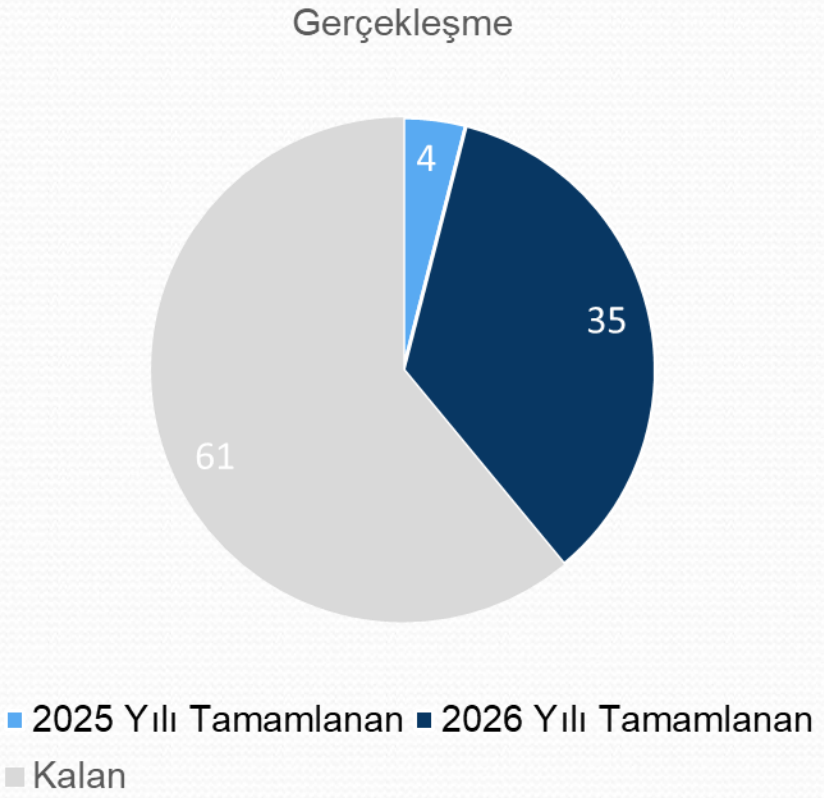

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ BİNASI








ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 500 kW ÇATI GES YAPIMI


- Sözleşme tarihi : 24.10.2025
- İşin başlangıç tarihi : 30.10.2025
- İşin bitim tarihi : 28.03.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 17.294.988,99-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 17.294.988,99-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 17.294.988,99-TL (KDV dahil)

İş tamamlanmış olup; geçici kabulü yapılmıştır. 2026 yılı fiziki gerçekleşme %5 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 ve toplam nakdi gerçekleşme %100 olmuştur.

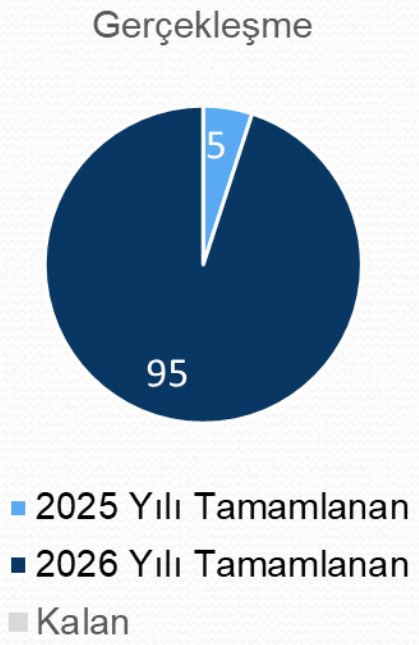

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BÜYÜK ONARIM İNŞAATI

- Sözleşme tarihi : 07.09.2026
- İşin başlangıç tarihi : 10.09.2026
- İşin bitim tarihi : 08.11.2026
- Toplam sözleşme bedeli : 1.350.000,00-TL (KDV dahil)
- Bugüne kadar ödenen tutar : 928.209,98-TL (KDV dahil)
- 2026 Yılı içinde ödenen tutar : 928.209,98-TL (KDV dahil)

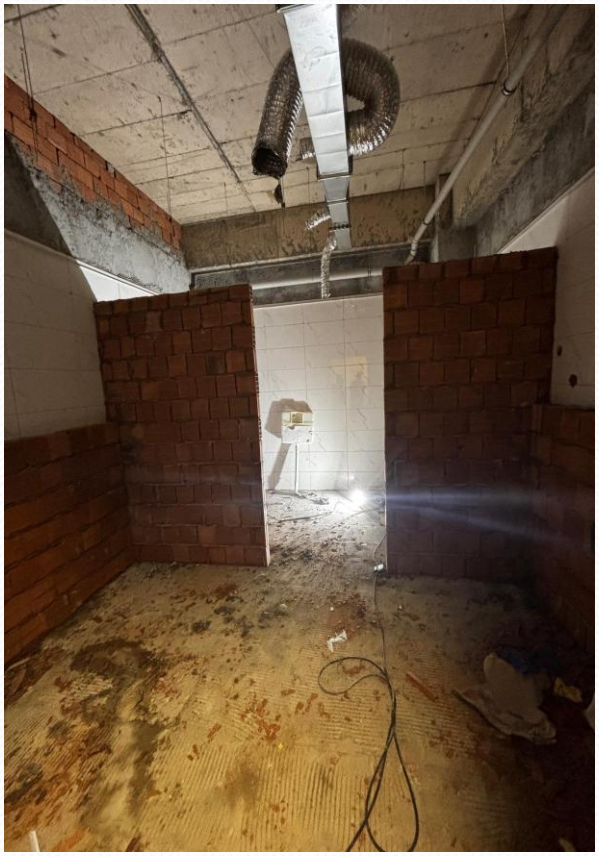



ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BÜYÜK ONARIM İNŞAATI

Tuğla duvar imalatları, kaba sıva imalatları ve seramik kaplama imalatları tamamlanmıştır. Boya işleri, asma tavan işleri, fotosel kapı işleri, kompakt kapı işleri devam etmektedir. 2026 yılı fiziki gerçekleşme ve toplam fiziki gerçekleşme %72 ve toplam nakdi gerçekleşme %69 olmuştur.

